





PLANO DE EXECUÇÃO					
EXECUTAR ATIVIDADES RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA!					
Manobrar equipamento abaixo para substituir os postes conforme projeto.					
Executar as atividades conforme projeto, demais alterações solicitar via D.I.					
Preparar cavas e postes para executar obra, após isso realizar o deslocamento.					
MO para manobra paga no P12. EXECUTAR P3 EM LV - DEIXAR DESCONEC.					
RECONDUTORAR V3-8. RETIRAR REDE MONO DE MT, ESTENDER REDE NOVA DE COMPACTA. - INSTALAR TR NOVO DE 30KVA NO P5.					
DESLOCAR CH. FUS. 1107048 DO P3 PARA O P8.					
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abriu	Chave Faca	1107048	6	5	30
Linha Viva?			Sim	CHI TOTAL	30

☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

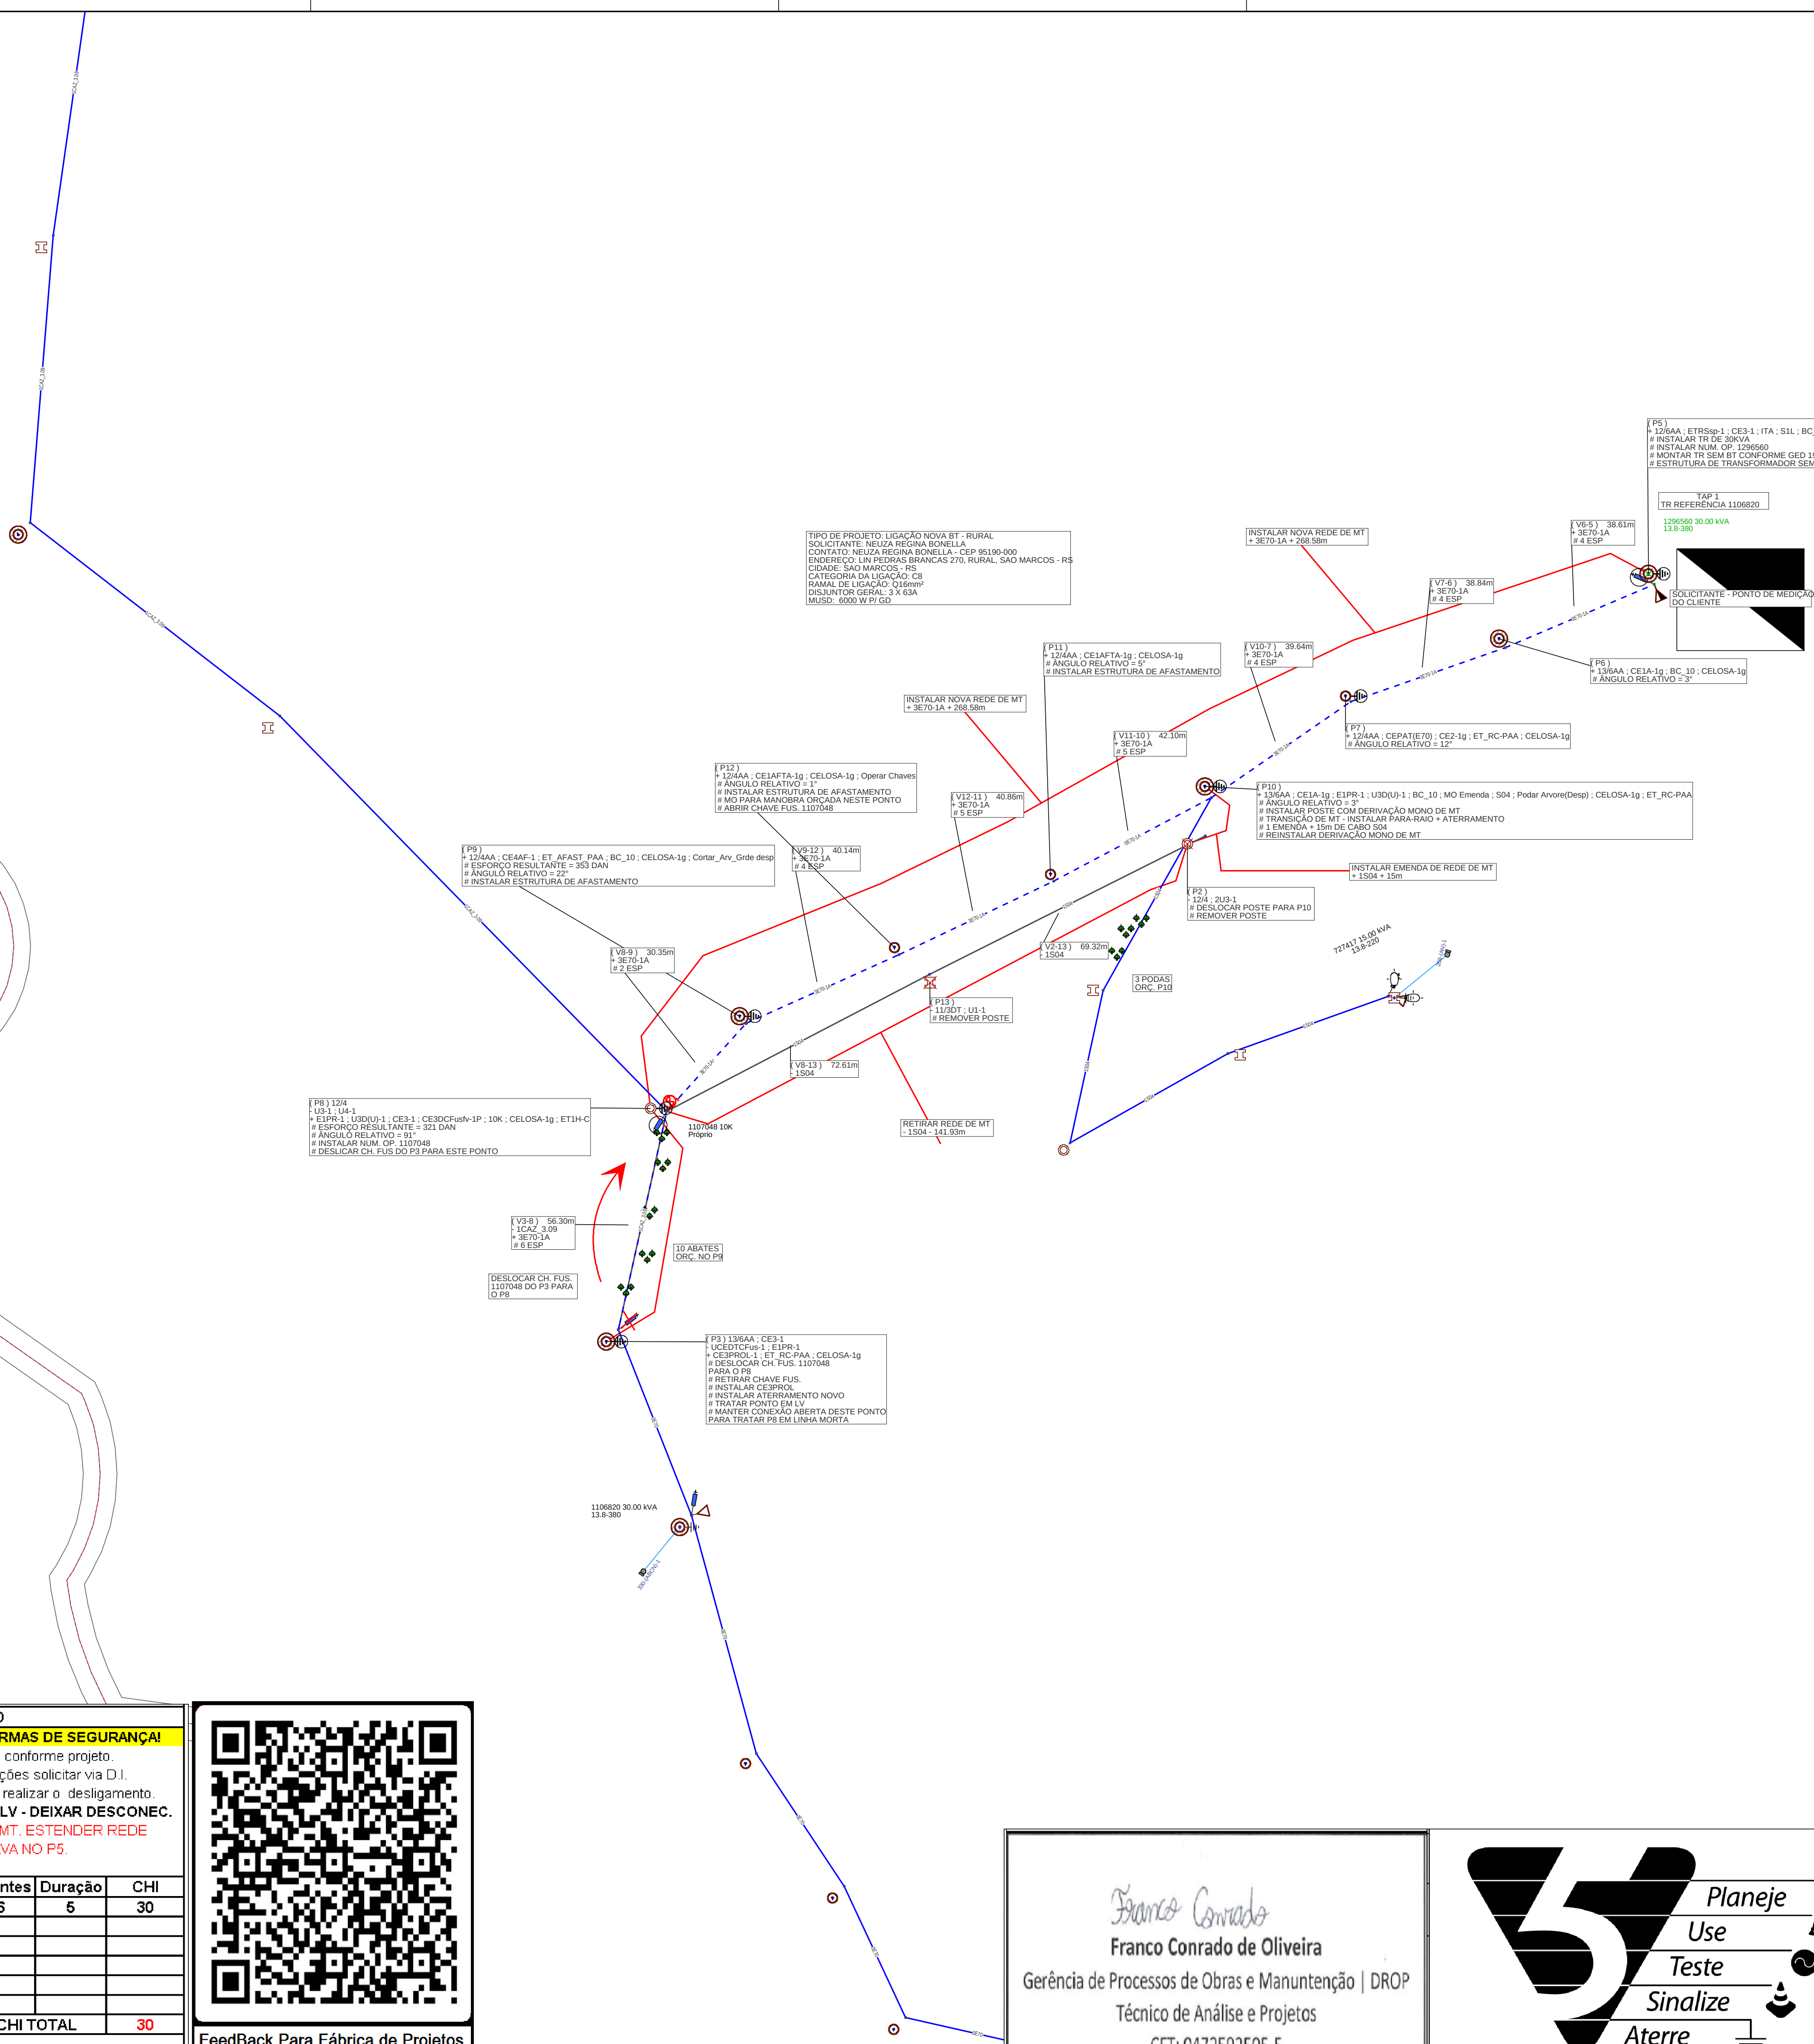

Franco Conrado
Franco Conrado de Oliveira
 Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
 Técnico de Análise e Projetos
 CFT: 0472592505-5

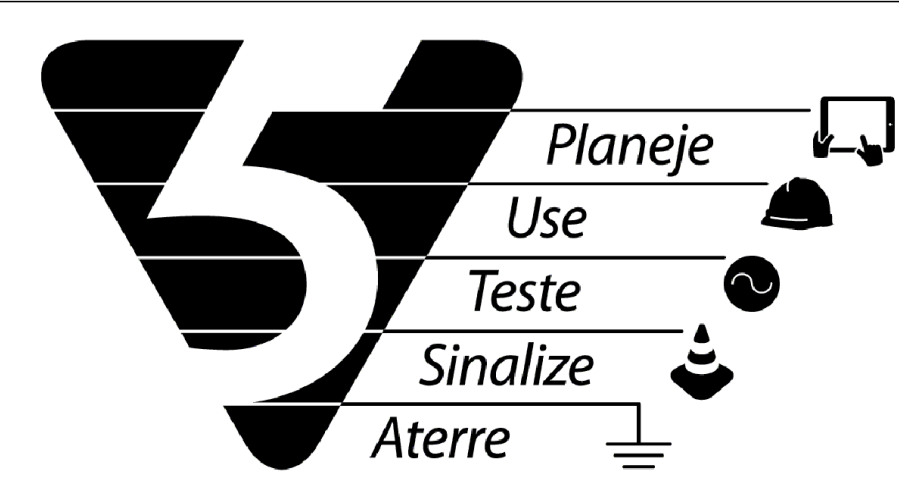

	Gerência de Serviços de Rede: SERRA		
	Município: São Marcos		
Cliente: NEUZA REGINA BONELLA			
Obra: LIGAÇÃO NOVA BT - RURAL			
Endereço: LIN PEDRAS BRANCAS 270, RURAL, SAO MARCOS - RS			
Responsável Técnico:  Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:850 Classe de Isolação: 15kV Projeto: Franco Corrado	Data: 02/12/2025 AL: SMC12 Projeto: 000007936573	Nota: 300001099995 Folha 1 Levantador: Marcio Bordin
