
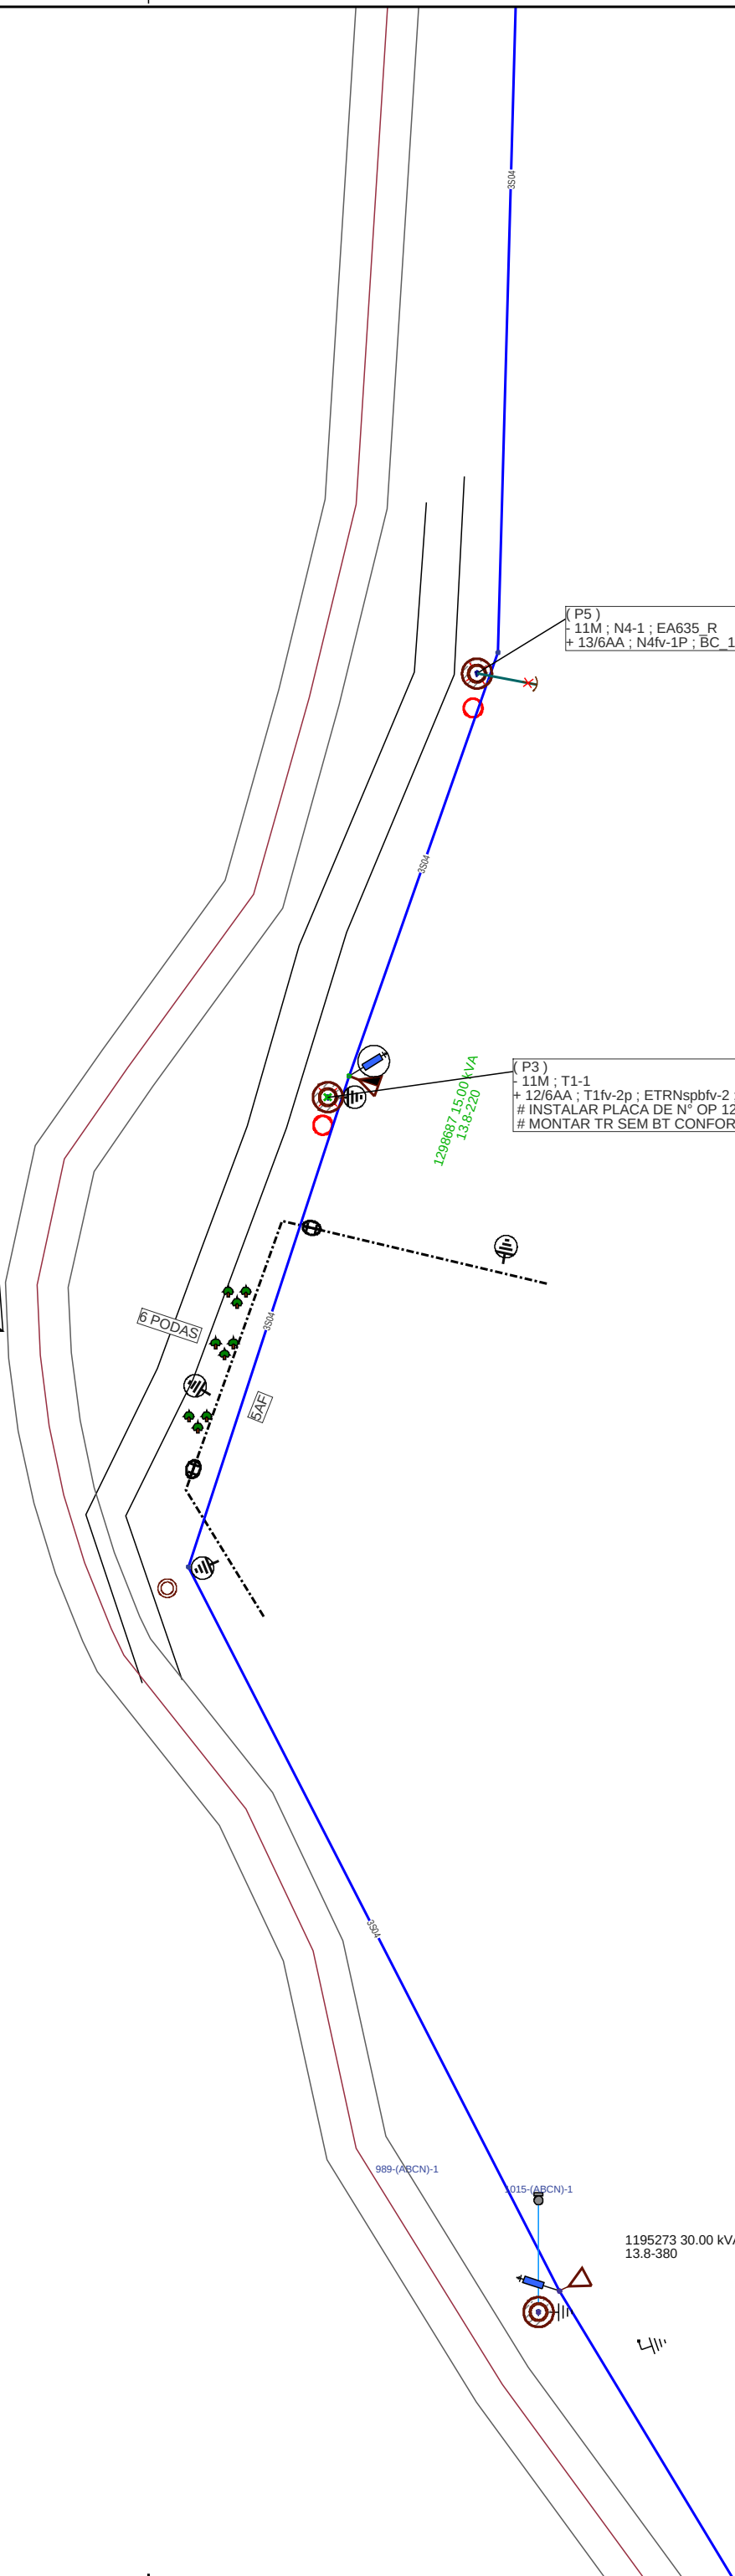



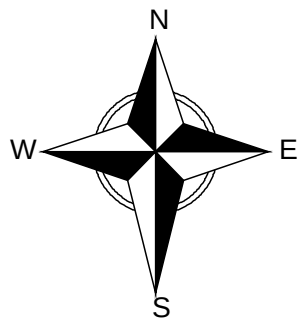

(P5)
+ 11M ; N4-1 ; EA635 R
+ 13/6AA ; N4fv-1P ; BC_10 ; PROTETOR PASSARO

(P3)
+ 11M ; T1-1
+ 12/6AA ; T1fv-2p ; ETRNspbv-2 ; S1L ; ITA ; TRM15_25/220v ; PROTETOR PASSARO ; 1H ; ATcerca2,4-Arame ; SeccCercaFarp ; Operar Chaves ; ET_TRNUAPAA ; BC_10
INSTALAR PLACA DE N° OP 1298687
MONTAR TR SEM BT CONFORME GED 19287 - ESTRUTURA DE TRANSFORMADOR SEM REDE SECUNDÁRIA

1195273 30.00 KVA
13,8-380

4"

PLANO DE EXECUÇÃO					
Manobrar equipamento representado abaixo e realizar a substituição dos postes indicados. Atentar-se a instalação de placas de nº operativo. Executar a atividade seguindo todas as normas de segurança.					
Seguir orientações conforme projeto, em caso de alterações solicitar via D.I.					
Ação	Equipamento	Número	Cientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusível	609276	102	5	510
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		510
☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)					



FeedBack Para Fábrica de Projetos

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Kauê Feltes de Moura

KAUÊ FELTES DE MOURA
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 034.733.240-43

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS

Obra: LIGAÇÃO NOVA BT - RURAL

Endereço: EST ZON GIACOMET 677 95125-000 CAXIAS DO SUL BR RS

Responsável Técnico:	Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:850	Data: 12/12/2025	Nota: 300001102228
		Classe de isolamento: 15kV	AL: CXD21	Folha 1
		Projetista: KAUE FELTES	Projeto: 000007942471	Levantador: ALESSANDRO SEVERO

AGILIDADE NÃO É PRESSA
O QUE MAIS IMPORTA É
FAZER DIREITO!
