


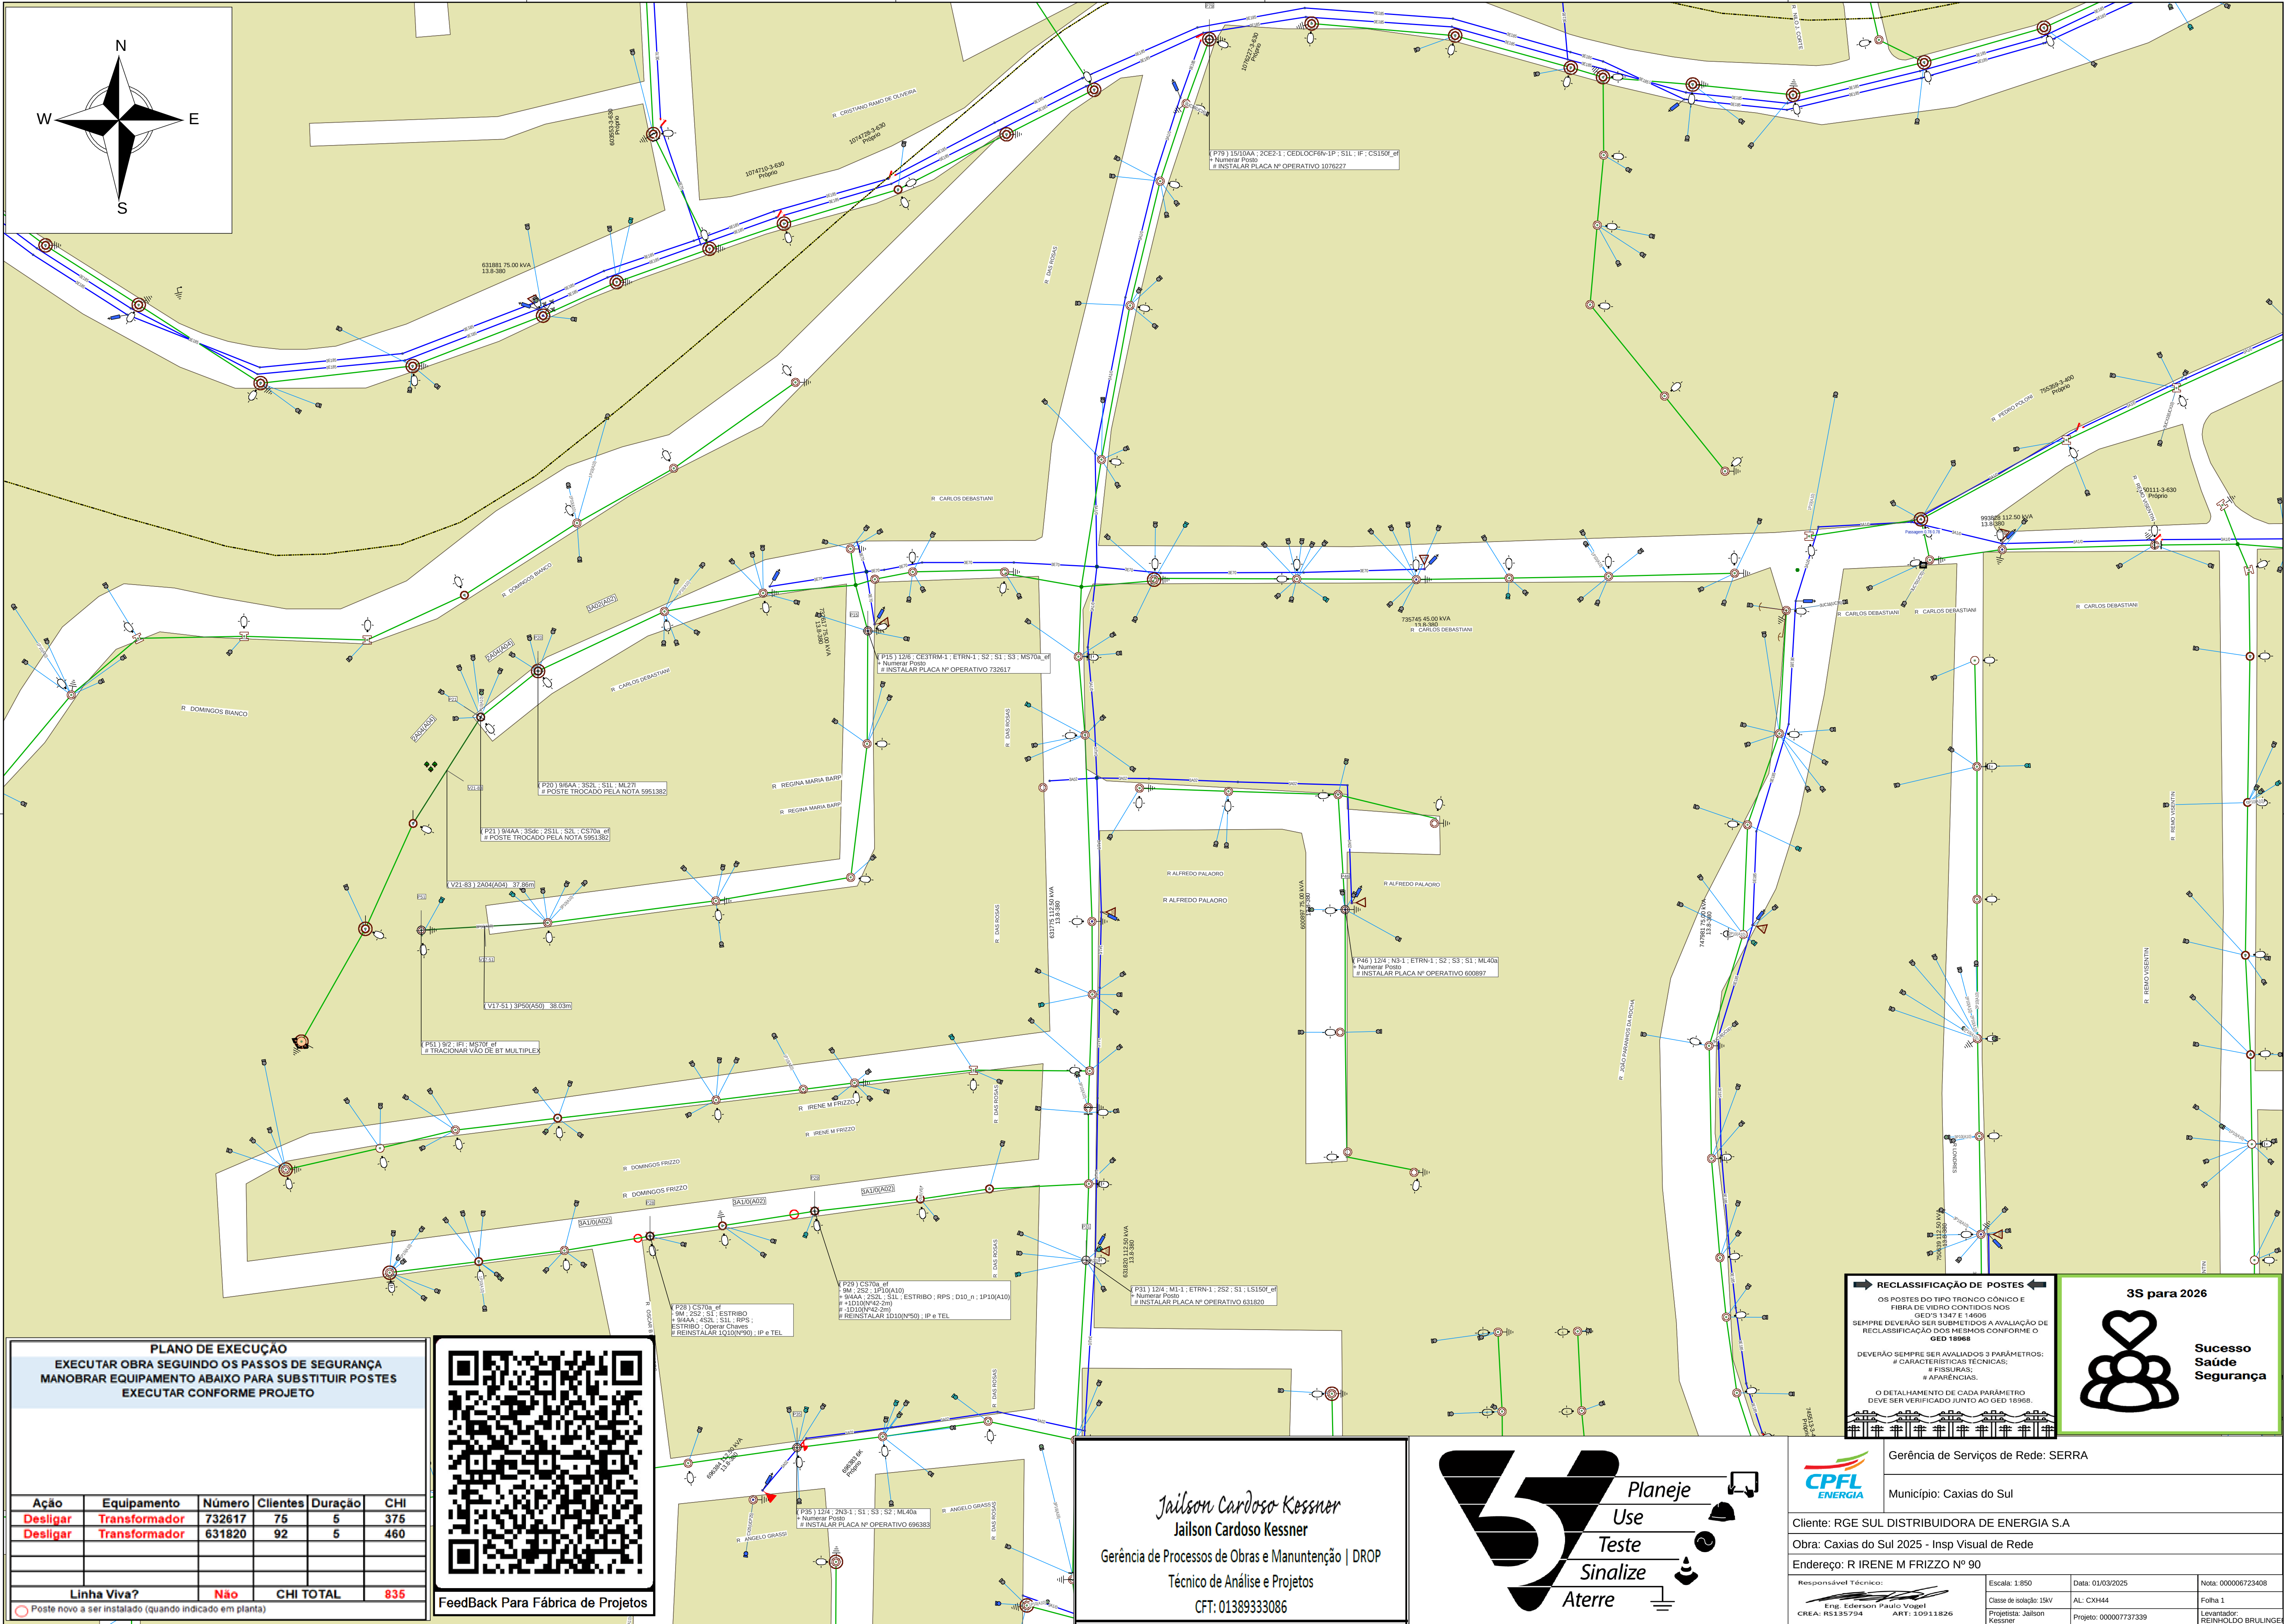

PLANO DE EXECUÇÃO					
EXECUTAR OBRA SEGUINDO OS PASSOS DE SEGURANÇA					
MANOBRAR EQUIPAMENTO ABAIXO PARA SUBSTITUIR POSTES					
EXECUTAR CONFORME PROJETO					
Ação	Equipamento	Número	Cientes	Duração	CHI
Desligar	Transformador	732617	75	5	375
Desligar	Transformador	631820	92	5	460
Linha Viva?			Não	CHI TOTAL	835
☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)					

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Jailson Cardoso Kessner

Jailson Cardoso Kessner

Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP

Técnico de Análise e Projetos

CFT: 01389333086

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14009 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O GED 18968

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

3S para 2026

Sucesso
Saúde
Segurança

Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: R IRENE M FRIZZO Nº 90

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS139794

Escala: 1:850
Classe de Isolação: 15kV
Projeto: Jailson Kessner

Data: 01/03/2025
AL: CXH44
Projeto: 00000773739

Nota: 000006723408
Folha 1
Levanteador: REINHOLDO BRULINER
