
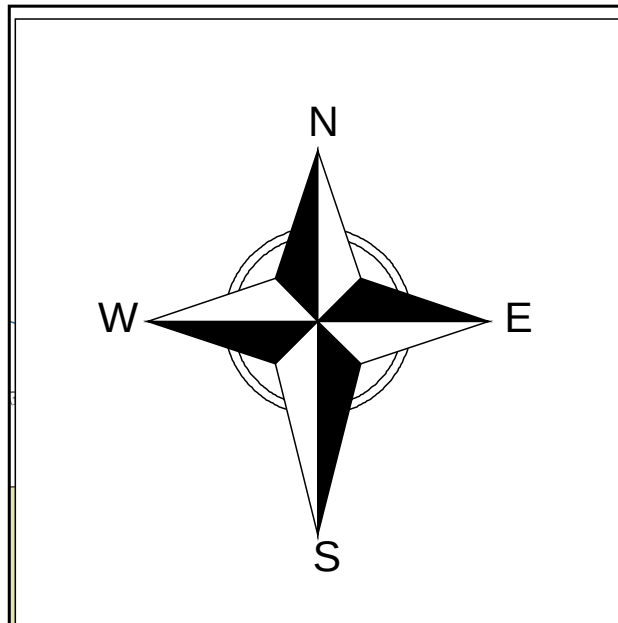


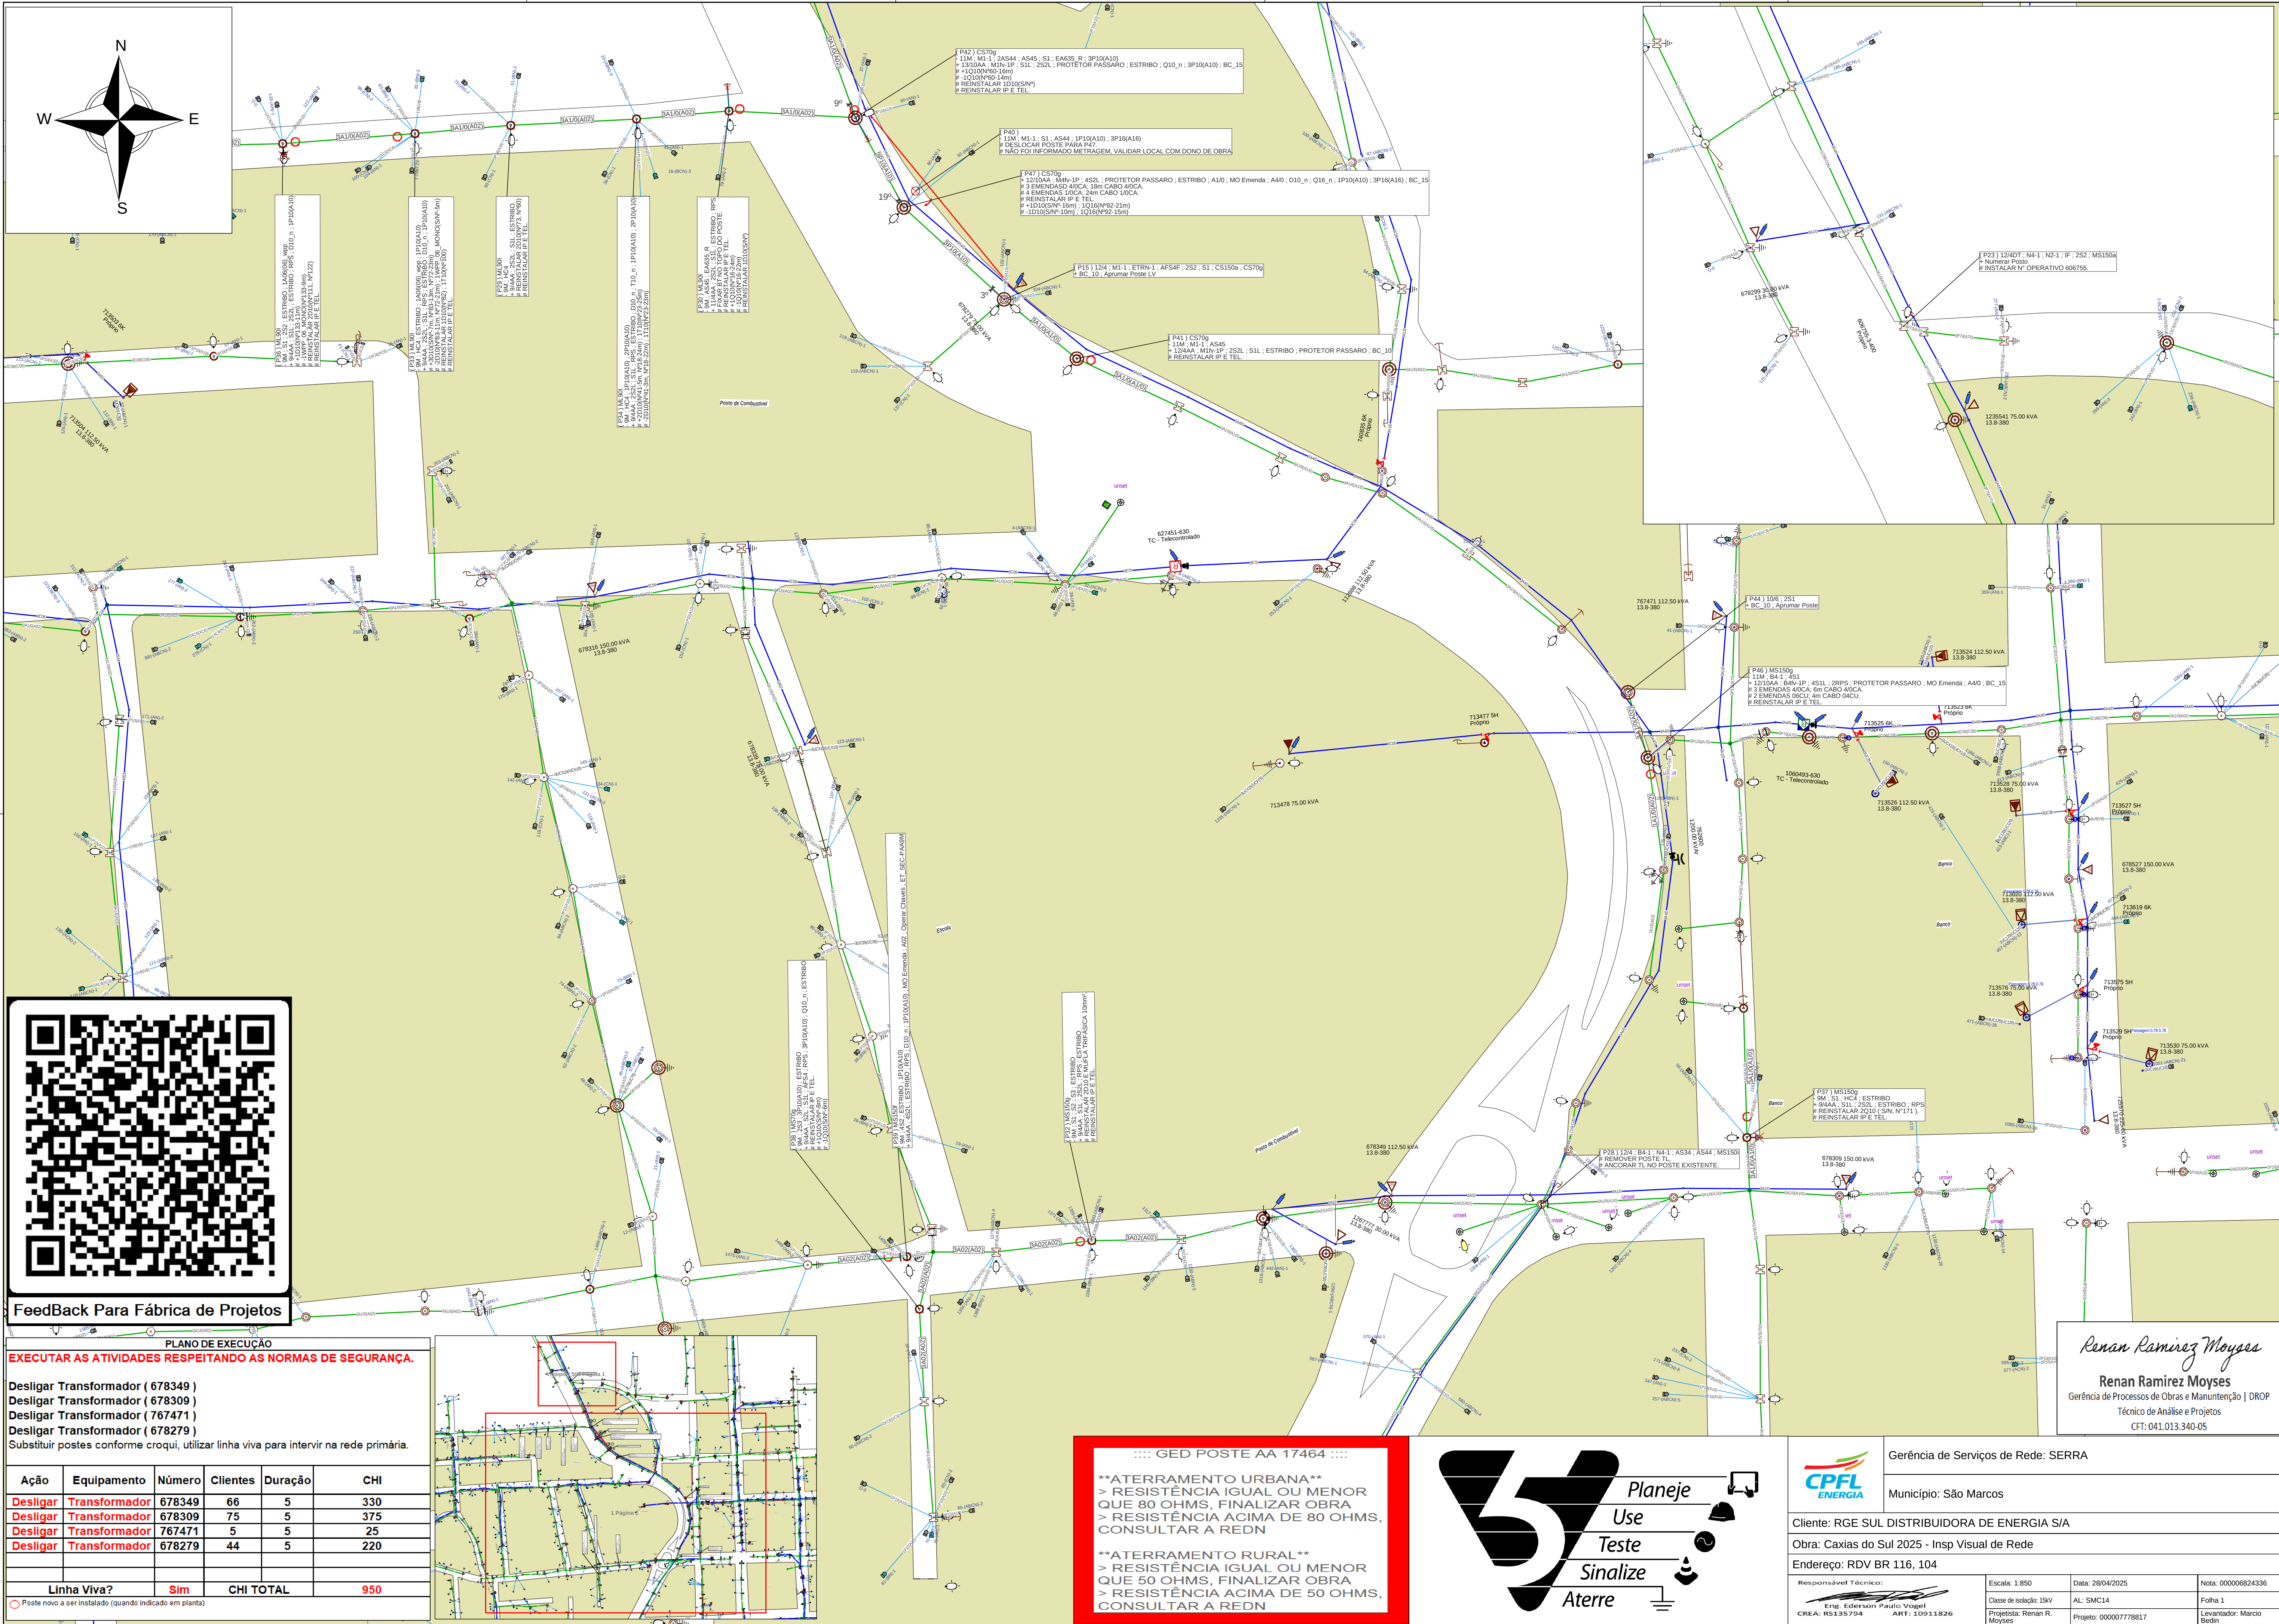


FeedBack Para Fábrica de Projetos

PLANO DE EXECUÇÃO
EXECUTAR AS ATIVIDADES RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA.

Desligar Transformador (678349)
Desligar Transformador (678309)
Desligar Transformador (767471)
Desligar Transformador (678279)
Substituir postes conforme croqui, utilizar linha viva para intervir na rede primária.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Desligar	Transformador	678349	66	5	330
Desligar	Transformador	678309	75	5	375
Desligar	Transformador	767471	5	5	25
Desligar	Transformador	678279	44	5	220
Linha Viva?					Sim
CHI TOTAL					950


Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

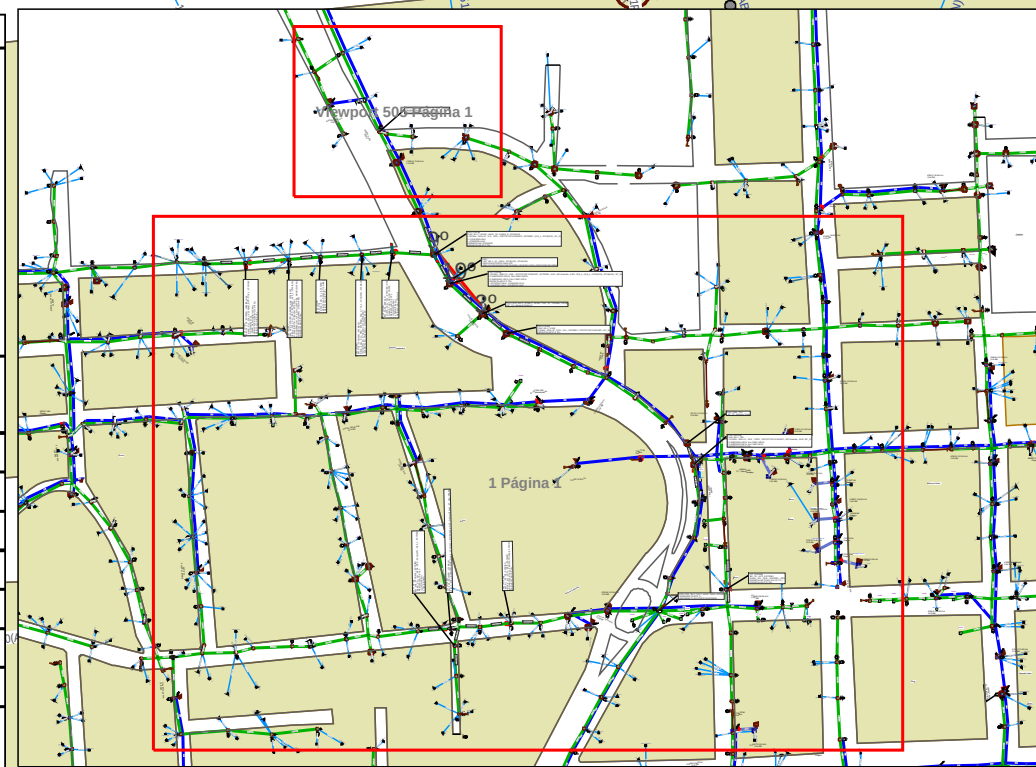

GED POSTE AA 17464

****ATERRAMENTO URBANA****
> RESISTÊNCIA IGUAL OU MENOR QUE 80 OHMS, FINALIZAR OBRA
> RESISTÊNCIA ACIMA DE 80 OHMS, CONSULTAR A REDN

****ATERRAMENTO RURAL****
> RESISTÊNCIA IGUAL OU MENOR QUE 50 OHMS, FINALIZAR OBRA
> RESISTÊNCIA ACIMA DE 50 OHMS, CONSULTAR A REDN

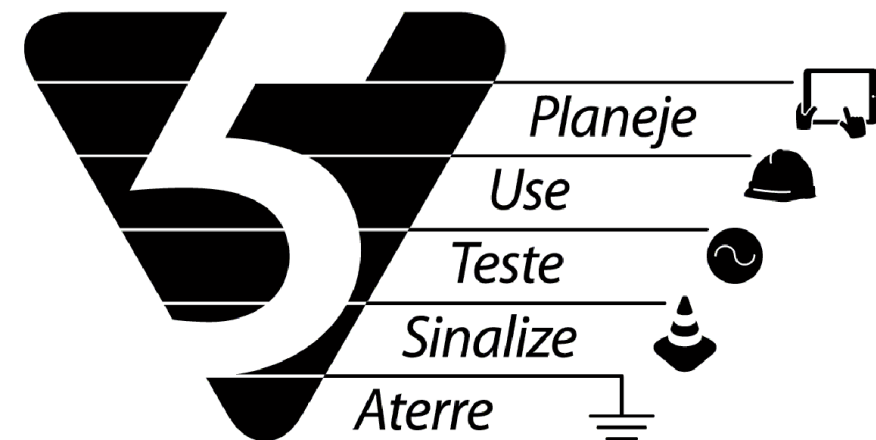

Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: São Marcos

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: RDV BR 116, 104

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS195794

Escala: 1:850
Classe de Isolação: 15kV
AL: SMC14

Data: 28/04/2025

Projeto: 00000778817

Nota: 00000682436

Folha 1

Levantador: Marcio Bedin

Renan Ramirez Moyses
Renan Ramirez Moyses
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 041.013.340-05
