


O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

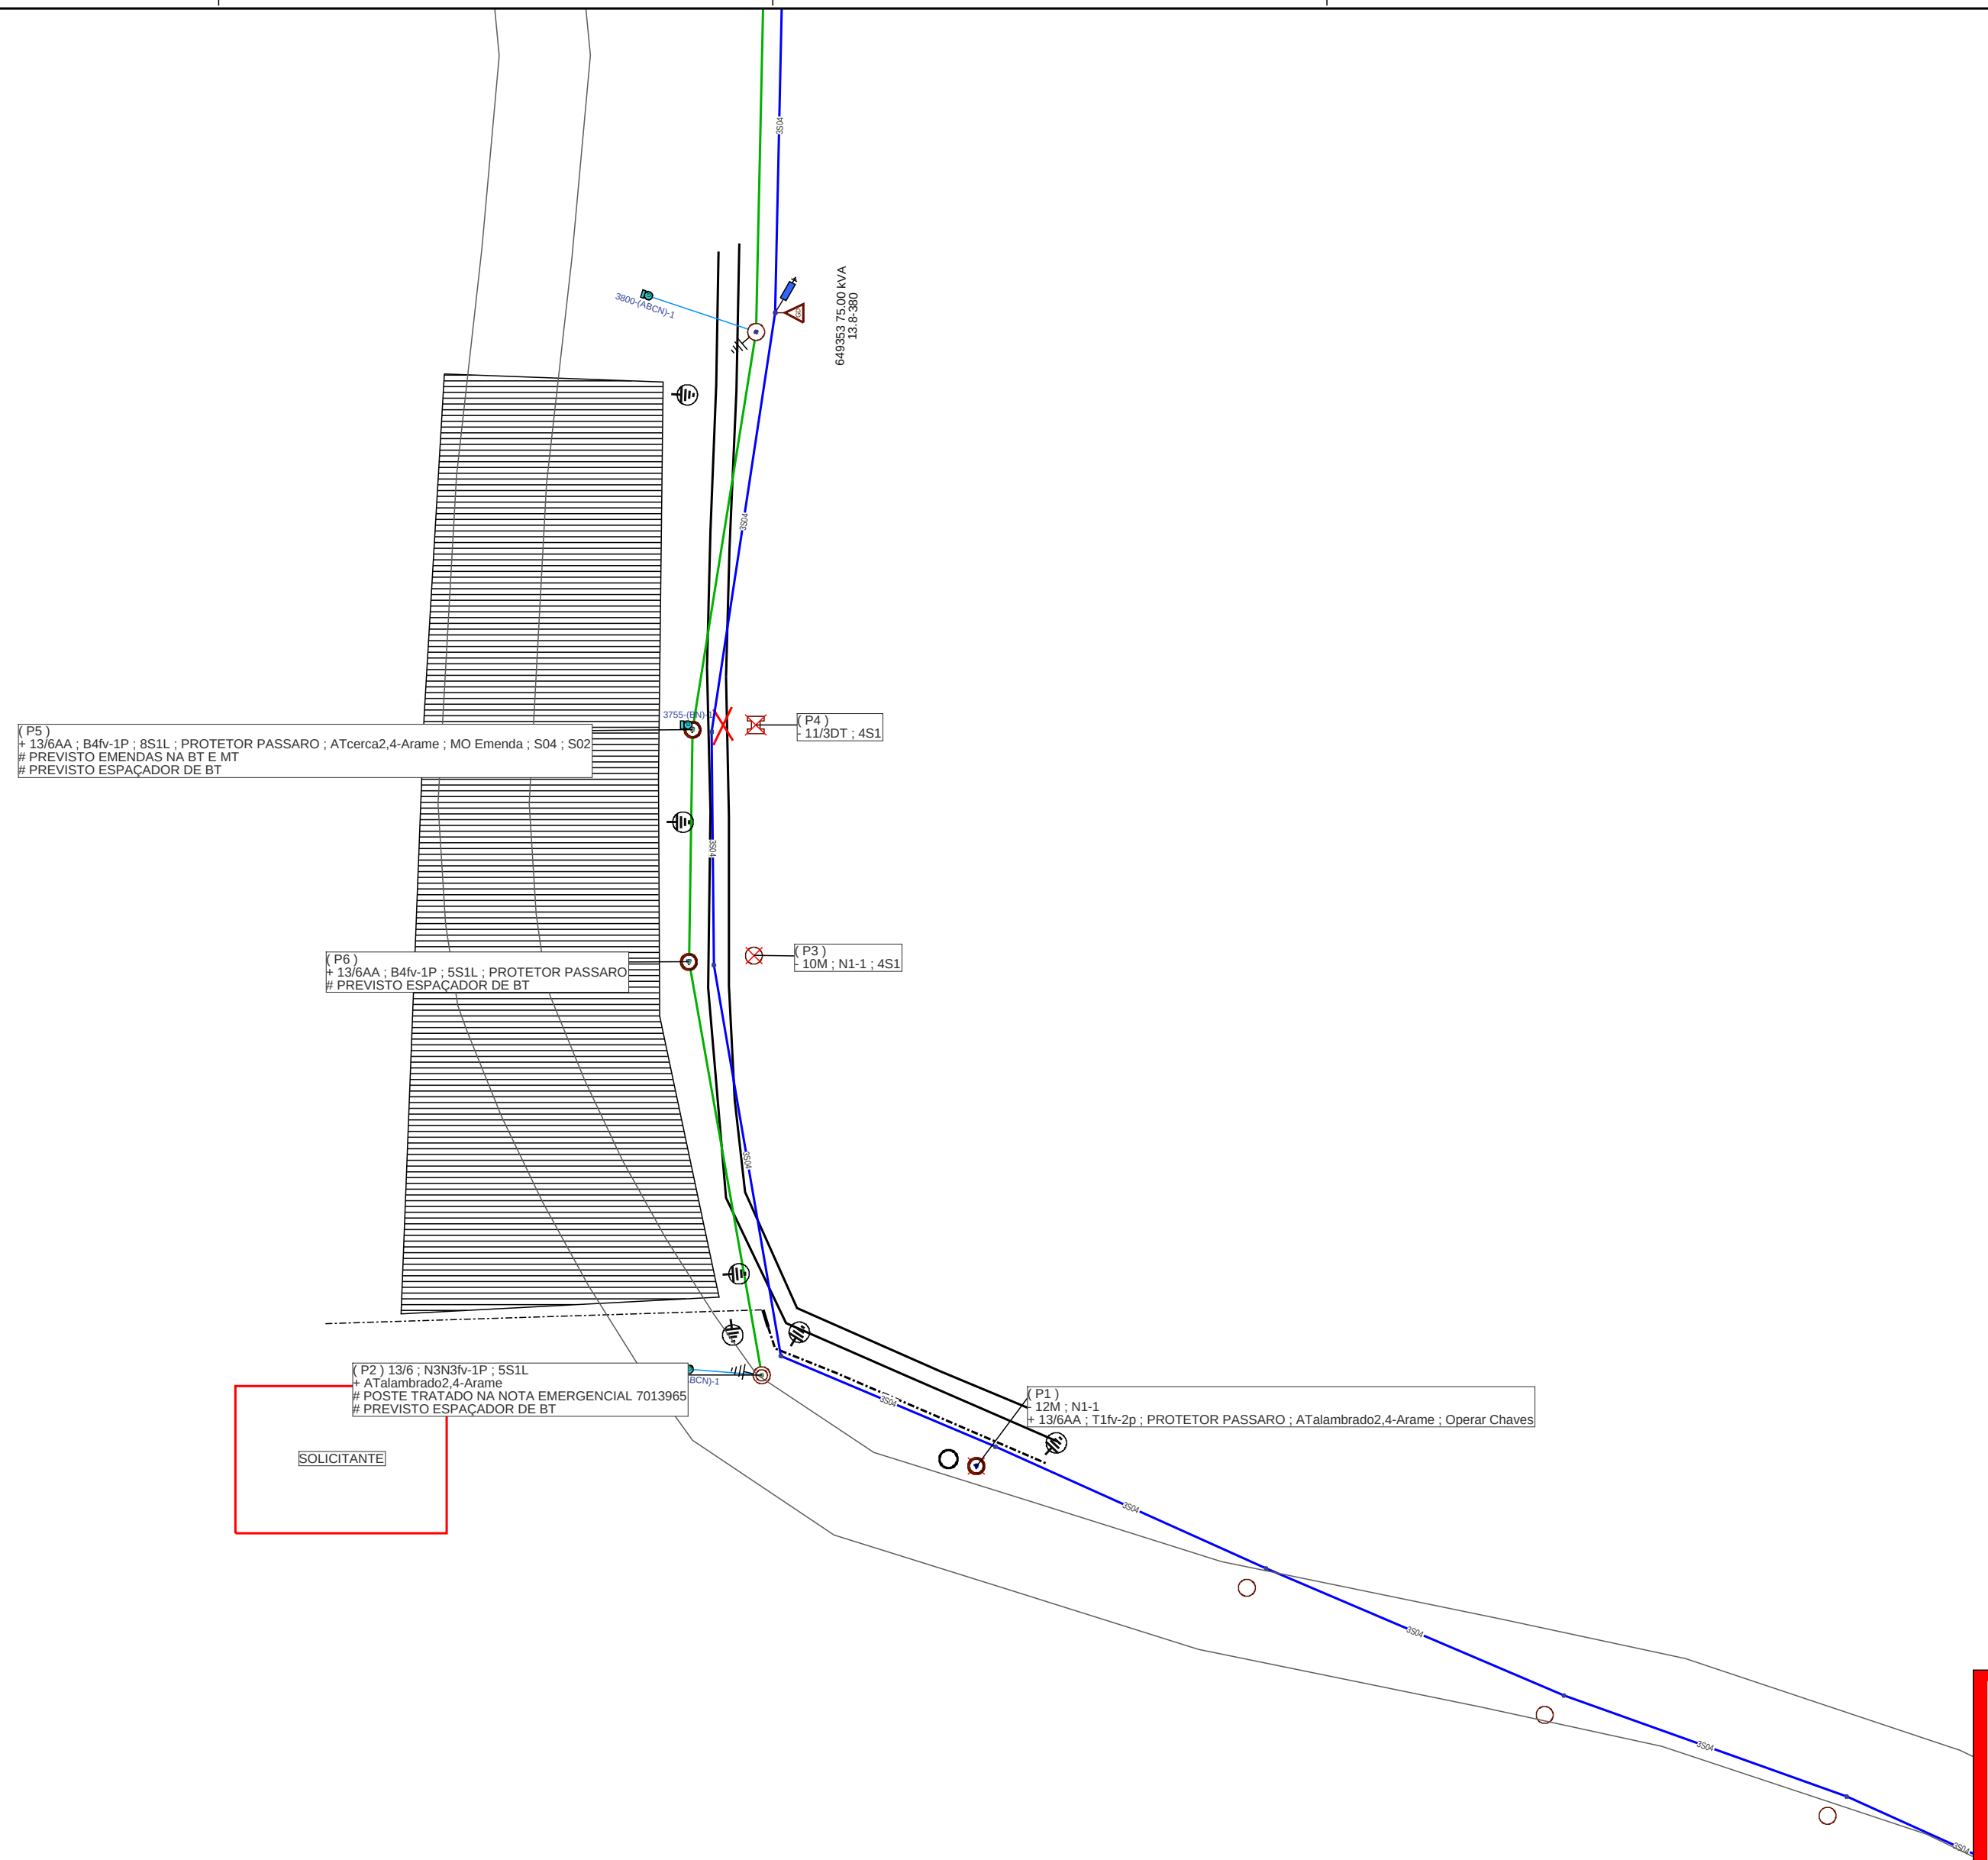

PLANO DE EXECUÇÃO


Trocar os postes P1, P2, P3 e P4 + Na preparação, já deixar os postes montados no local e cavas abertas + No desligamento (CHFUS 309387), erguer os postes + Passar rede para os postes novos + Retirar os postes velhos.

Se possível, na mesma programação podem ser executadas as seguintes notas 300000877469, 5498541, 5485835, 5498506, 300000878420, 30000000712780,

Ação	Equipamento	Número	Cientes	Duração	CHI
Abriu	Chave Fusivel	309387	30	5	150
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		150

☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos



Wellerson Avila

Wellerson Amaral Avila
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 04993185014



Gerência de Obras e Manutenção

Município: Flores da Cunha

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Obra: Substituição de Poste - OS 69939018

Endereço: CAP S VITOR 3700 - CAP S VICTOR - FLORES DA CUNHA

Responsável Técnico:

Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850

Classe de isolamento: 15kV

	Projeta: Wellerson Avila

Data: 20/06/2025

AL: FCU25

ila Projeto: 000007819071

Nota: 000006856840

Folha 1

Levantador Alessandro
Severo
