


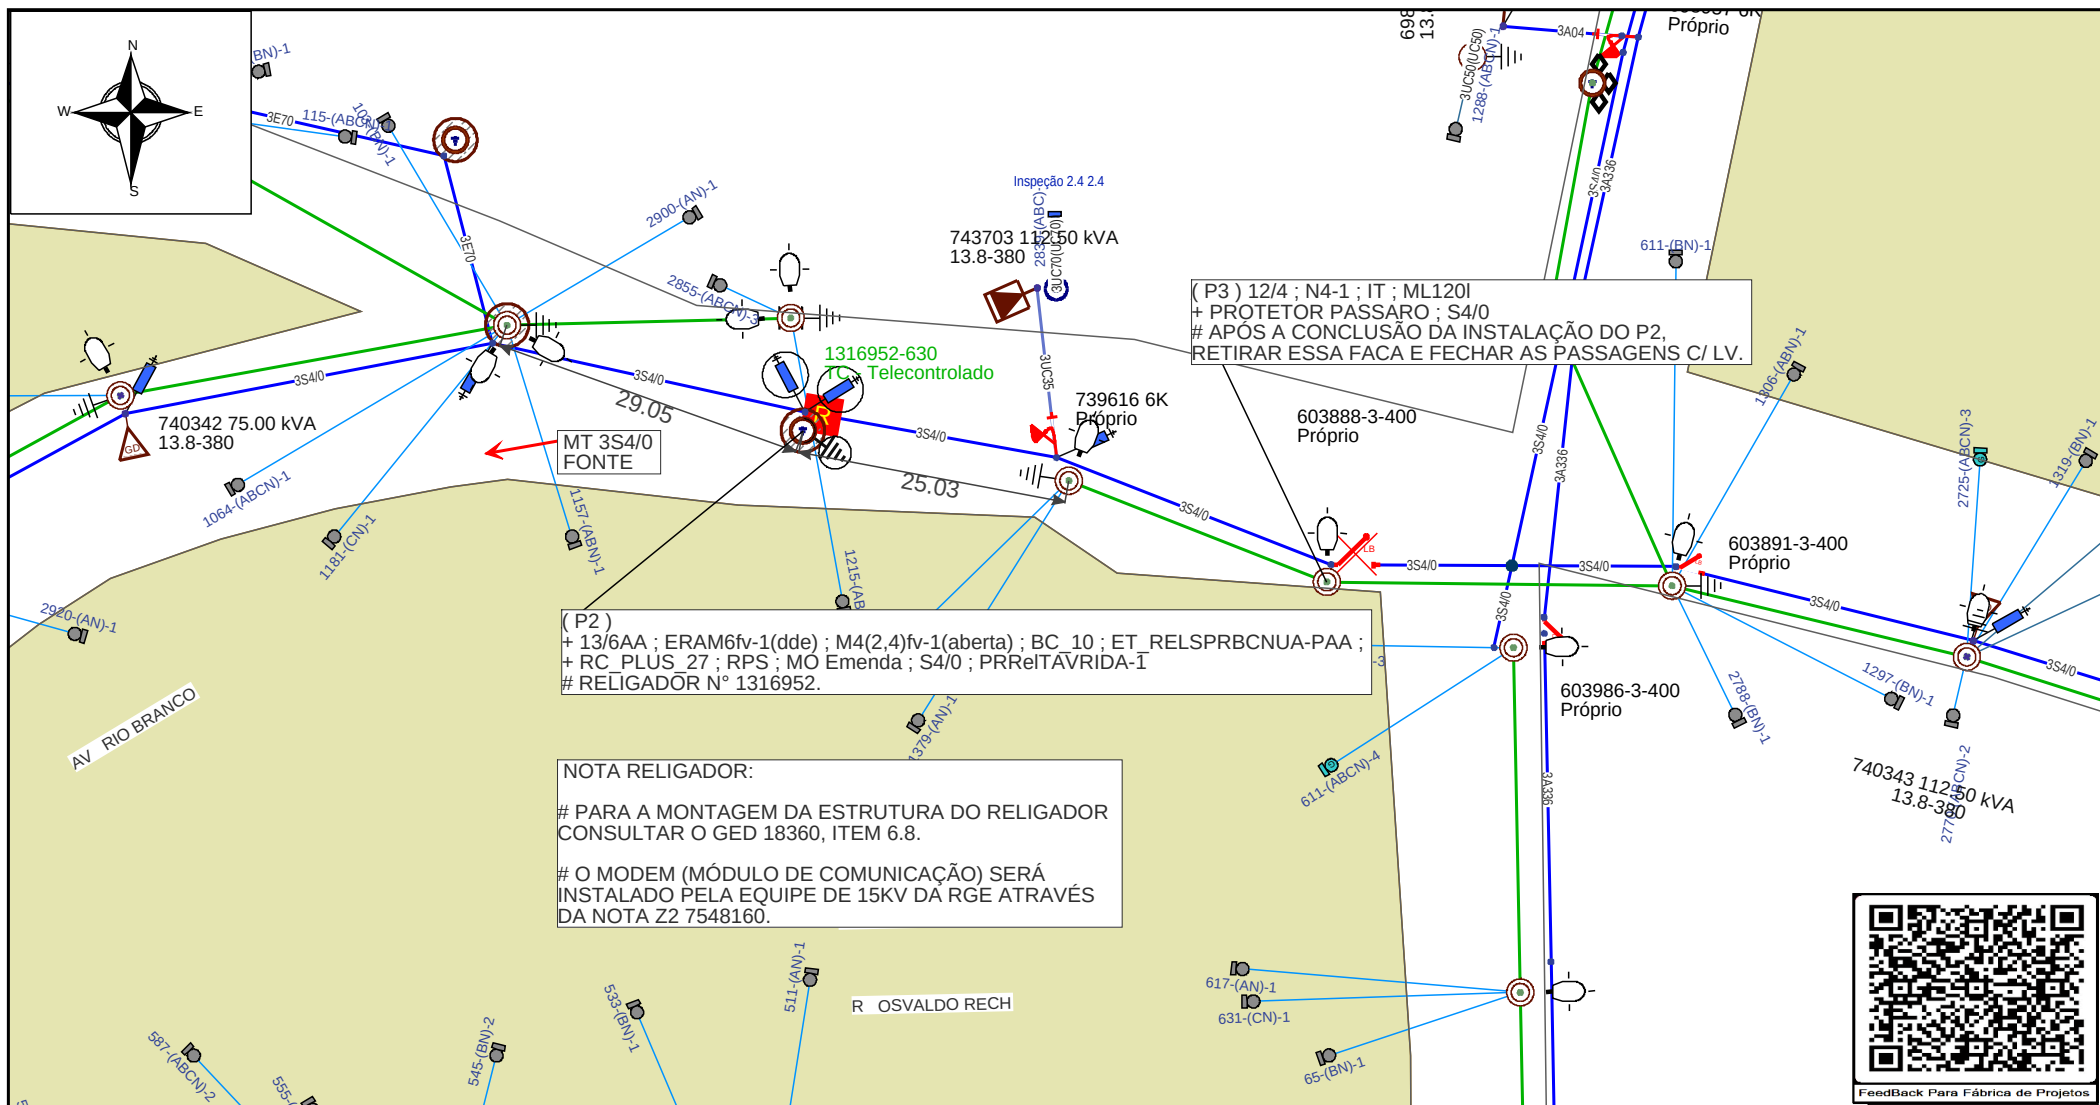

PLANO DE EXECUÇÃO					
EXECUTAR ATIVIDADES COM SEGURANÇA!					
INSTALAR POSTE E RELIGADOR N/F.					
PREPARAR A OBRA DEIXANDO A CAVA ABERTA E O POSTE MONTADO, APÓS A PREPARAÇÃO MARCAR PLD CONFORME MANOBRA ABAIXO.					
EXECUTAR EM CONJUNTO COM AS NOTAS 7079471, 7079268, 7079 247 E 7079472.					
RETIRAR FACA 603888 E FECHAR AS PASSAGENS COM LV.					
EXECUTAR ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO. ALTERAÇÕES, SOLICITAR D. I.					
Ação	Equipamento	Número	Cientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Faca	603903	90	5	450
Abrir	Chave Faca	603888	0	5	0
Fechar	Chave Faca	603980	0	5	0
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		450

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Edson Dilmar Papalia Flores
Edson Dilmar Papalia Flores
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 220.942.817-3

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Obra: 077-2026_AP_CONF_INT_CXD22_CXD11- EQUI 3

Cliente: CPFL RGE

Endereço: AV RIO BRANCO, 1215, CAXIAS DO SUL, RS

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:700	Data: 08/10/2025	Nota: 000006886224
	Classe de isolamento: 15kV	AL: CXD22	Folha 1
	Projetista: EDSON PAPALIA	Projeto: 000007946876	Levantador: RICARDO DE ALBUQUERQUE
