


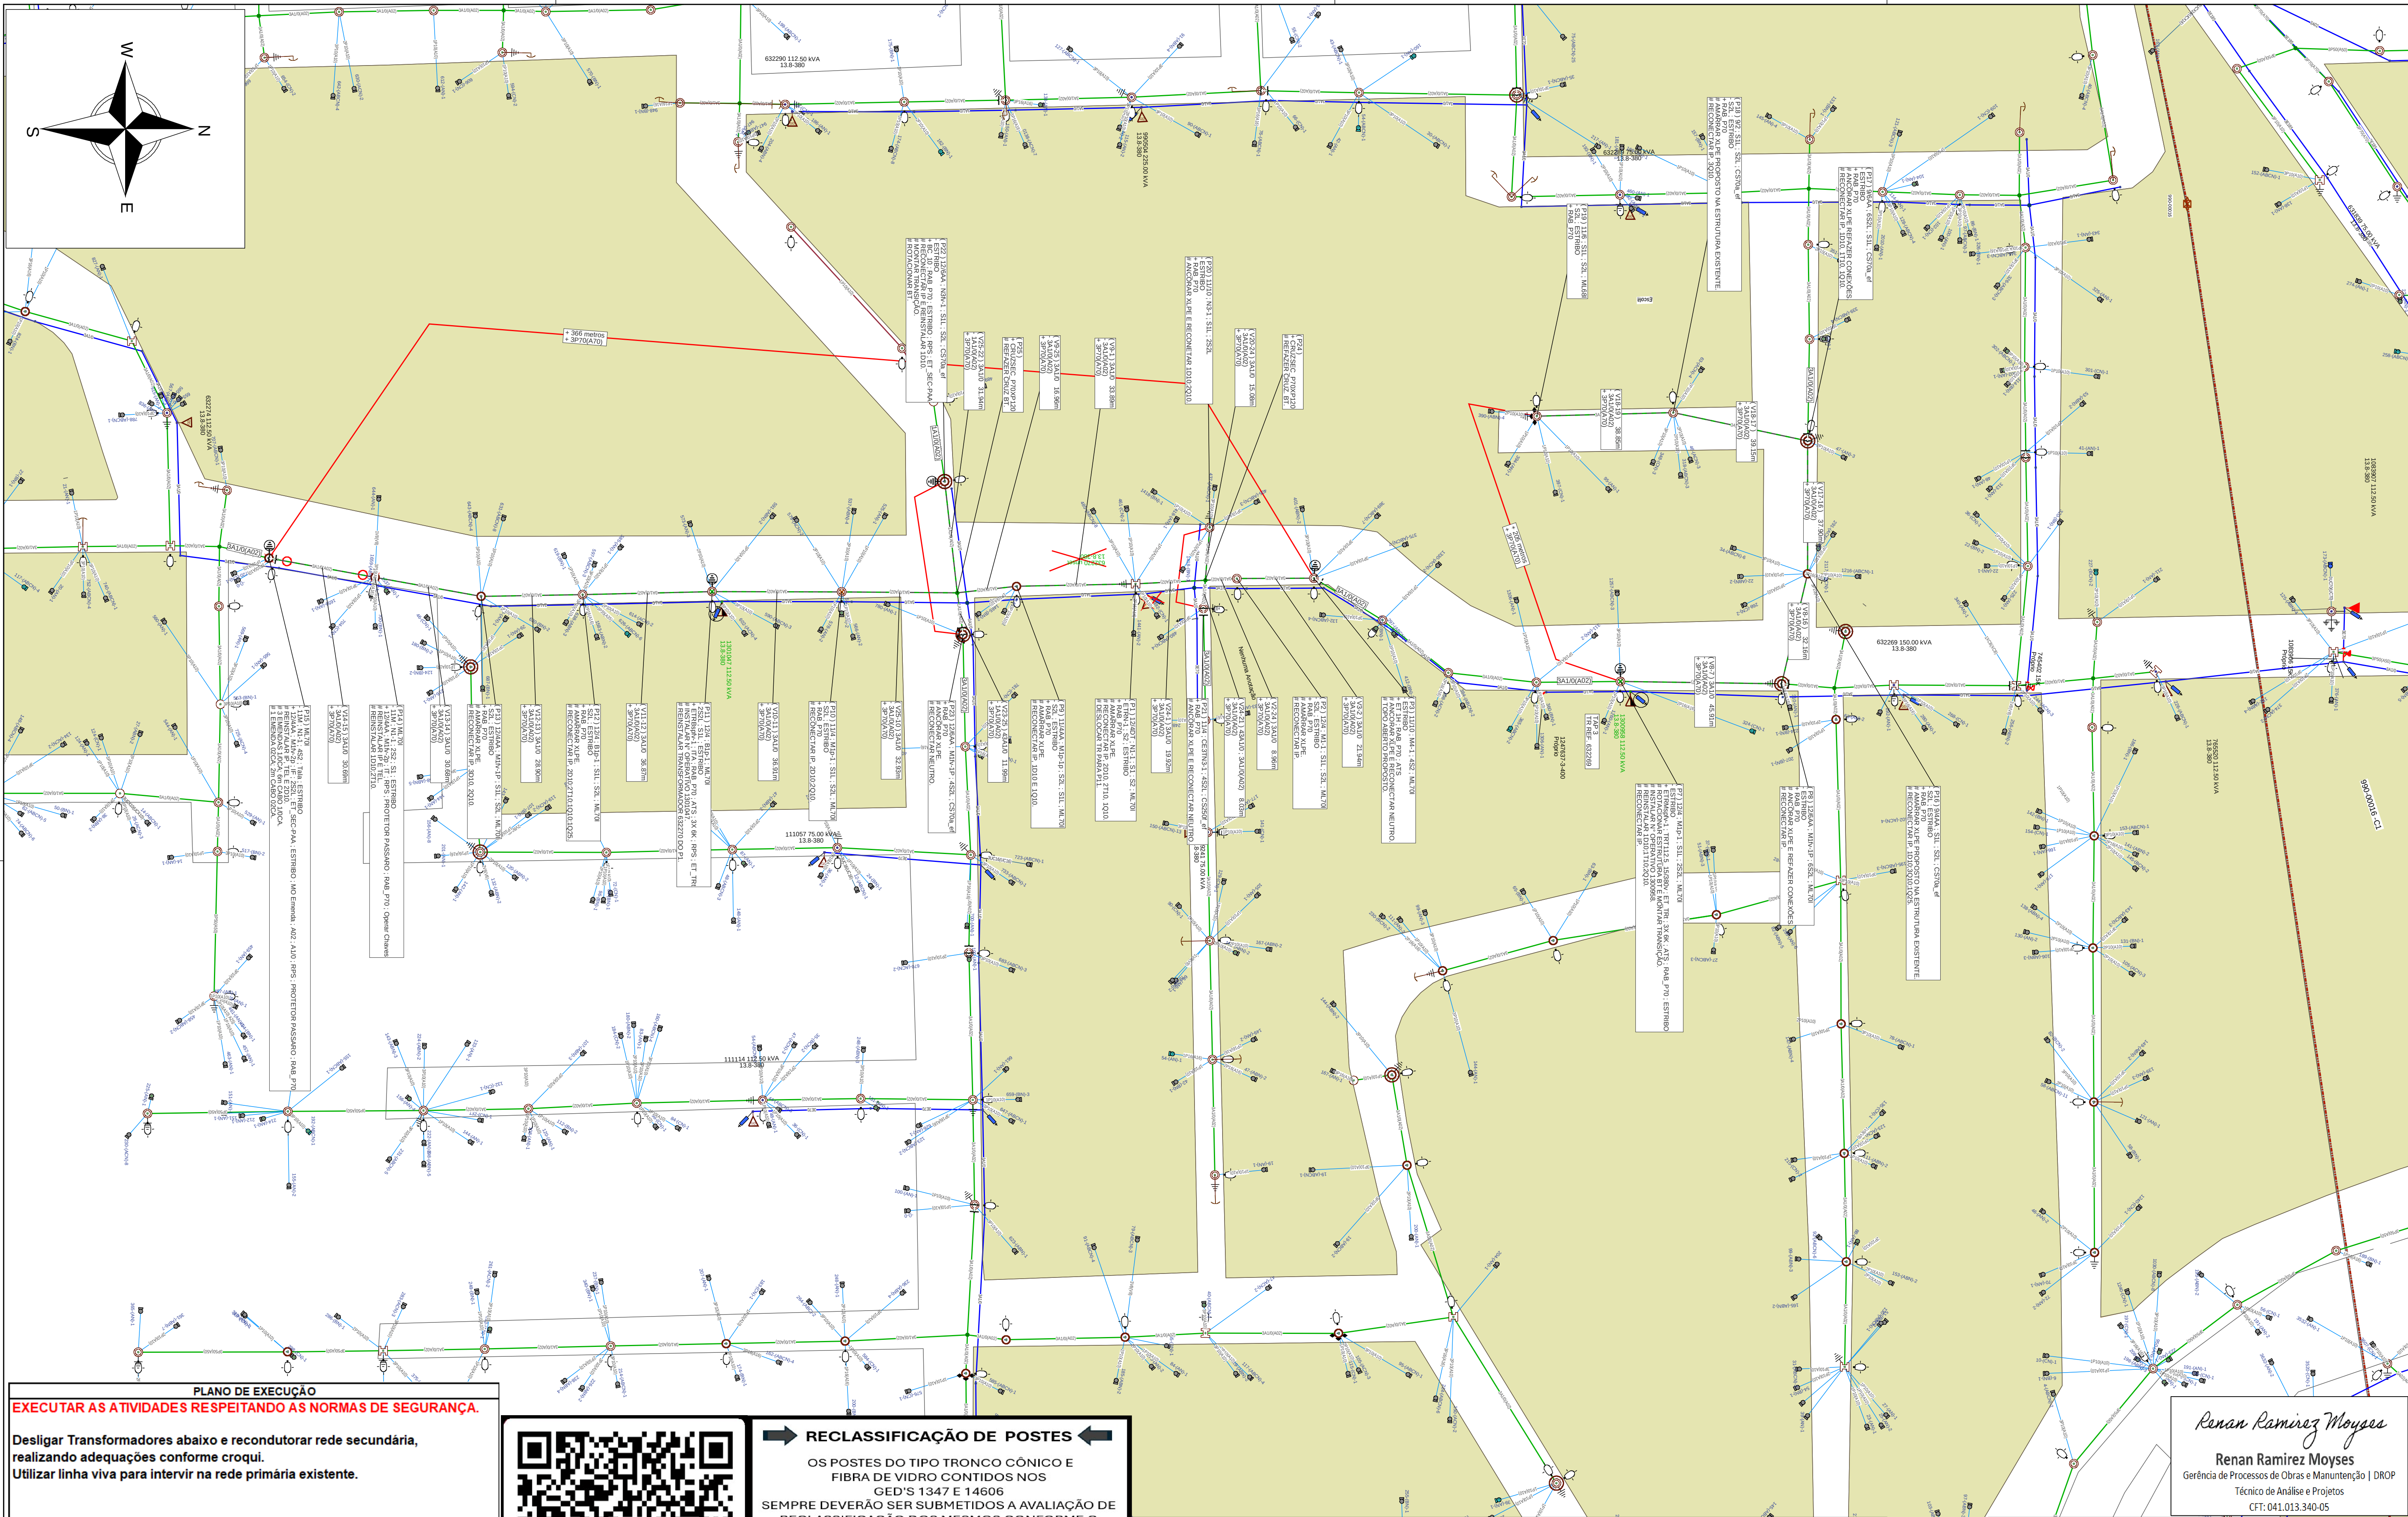

**PLANO DE EXECUÇÃO**

**EXECUTAR AS ATIVIDADES RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA.**

Desligar Transformadores abaixo e recondutorar rede secundária, realizando adequações conforme croqui.

Utilizar linha viva para intervir na rede primária existente.

| Ação        | Equipamento   | Número | Clientes  | Duração | CHI  |
|-------------|---------------|--------|-----------|---------|------|
| Desligar    | Transformador | 632289 | 71        | 4       | 284  |
| Desligar    | Transformador | 632270 | 181       | 5       | 905  |
| Desligar    | Transformador | 632269 | 86        | 4       | 344  |
| Desligar    | Transformador | 769241 | 34        | 4       | 136  |
| Desligar    | Transformador | 111057 | 67        | 4       | 268  |
| Desligar    | Transformador | 632274 | 133       | 5       | 665  |
| Linha Viva? |               | Sim    | CHI TOTAL |         | 2602 |

☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)



FeedBack Para Fábrica de Projetos

**RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES**

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O GED 18968

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:

- # CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
- # FISSURAS;
- # APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

**ATENÇÃO E SEGURANÇA**

**CAMINHAM JUNTAS**

Planeje  
Use  
Teste  
Sinalize  
Aterre

Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: Caxias do Sul

Cliente: CPFL RGE

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: R THEREZA DALCANALI ZUGNO, 324

Responsável Técnico:  
Eng. Ederson Paulo Vogel  
CREA: RS195794

Escala: 1:850  
Classe de Isolção: 15kV

Data: 02/12/2025

Nota: 000006930182

Folha 1

Projeto: 000007936592

Levantador: Ricardo Quevedo De Albuquerque
