


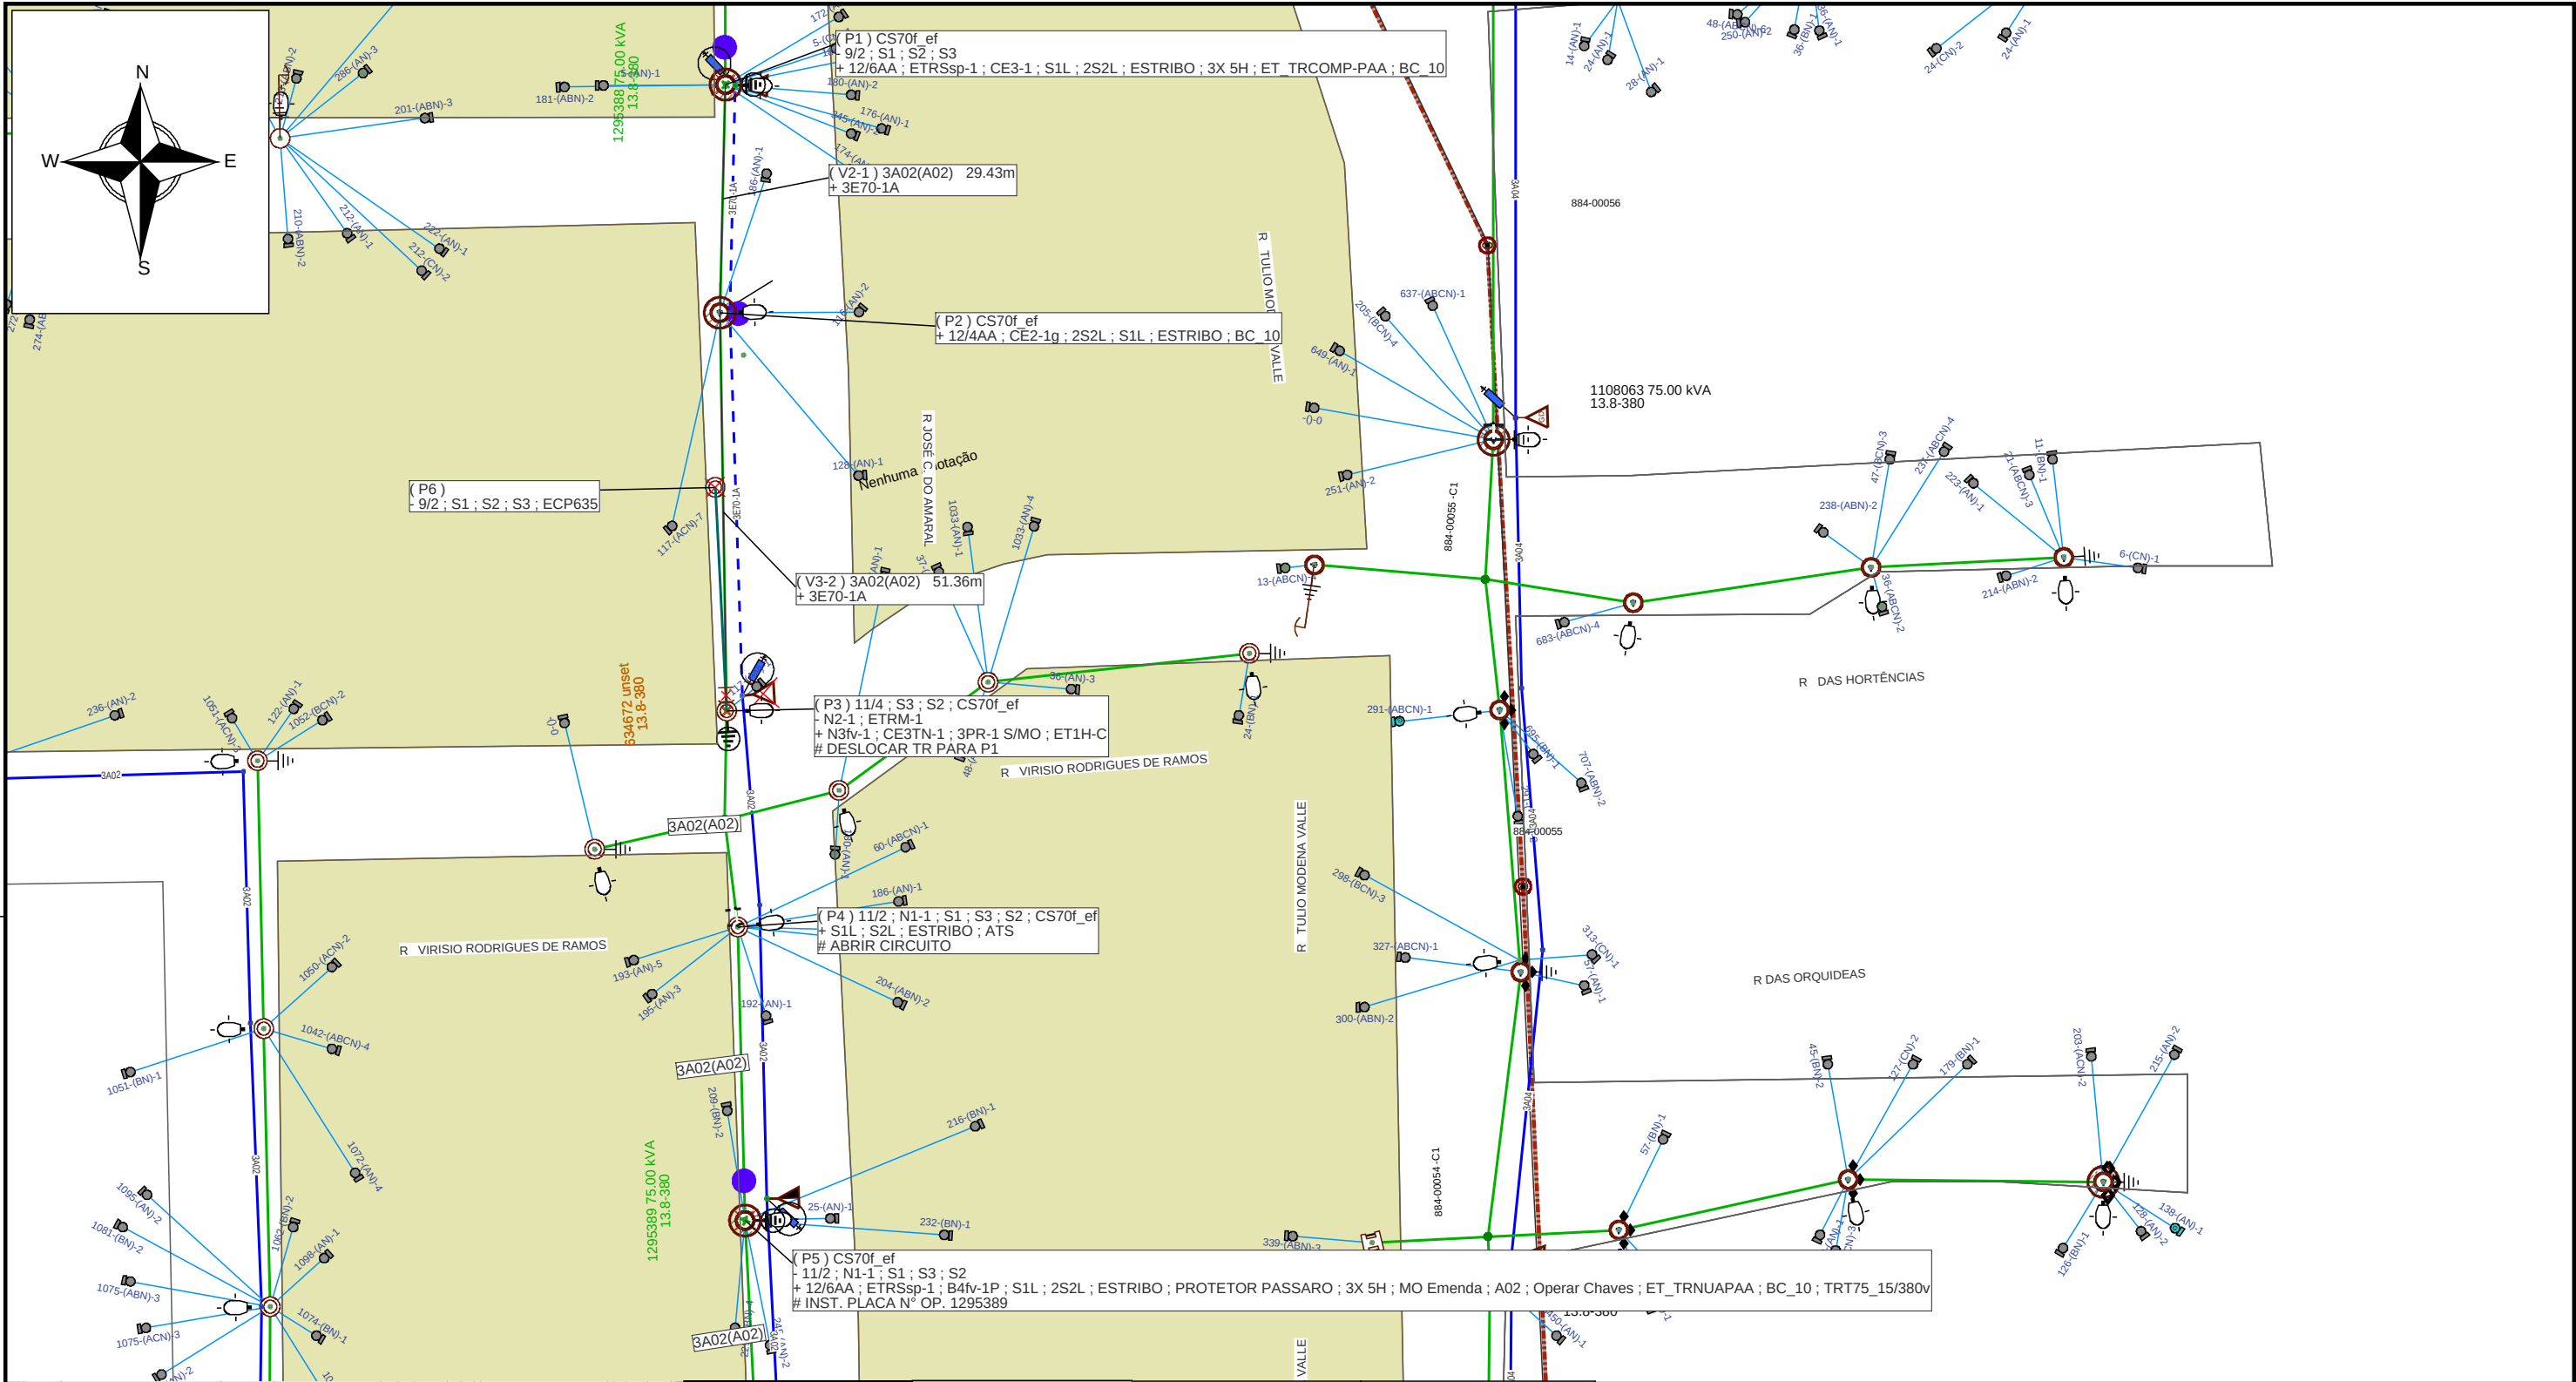

SUBSTITUIR POSTES CONFORME CROQUI DO KAFFA;
SEGUIR DP CONFORME EXPOSTO ABAIXO;

NÃO FORAM LOCALIZADAS OTIMIZAÇÕES PARA DEC PROGRAMADO					Quantidade de equipes sugeridas para o desligamento	0
Equipamento Destigado	Número Operativo	Clientes Destigados	Duração da Intervenção	CHI Total	Observações (se necessário)	
TRANSFORMADOR	634672	115	5	575		
Banco de Capacitores						
Banco de Filtros						
Banco de Reatores						
Outros						
ESTUDO DE CHI				Total	575	

RE: 6009212
Técnico: RICARDO QUEVEDO DE ALBUQUERQUE

Data da análise: 01/12/2025

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 1406 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O GED 10968

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 10968.



Seja a mudança que você quer ver na segurança do trabalho.



FeedBack Para Fábrica de Projetos



Henrique Silva Erguy Junior
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise Projetos I
CFT: 5287547404-9



Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: 634672

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 30/06/2025	Nota: 000006783060
Classe de isolamento: 15kV	AL: CXD24	Folha 1
Projetista: HENRIQUE ERGUY	Projeto: 000007823288	Levantador RICARDO
