


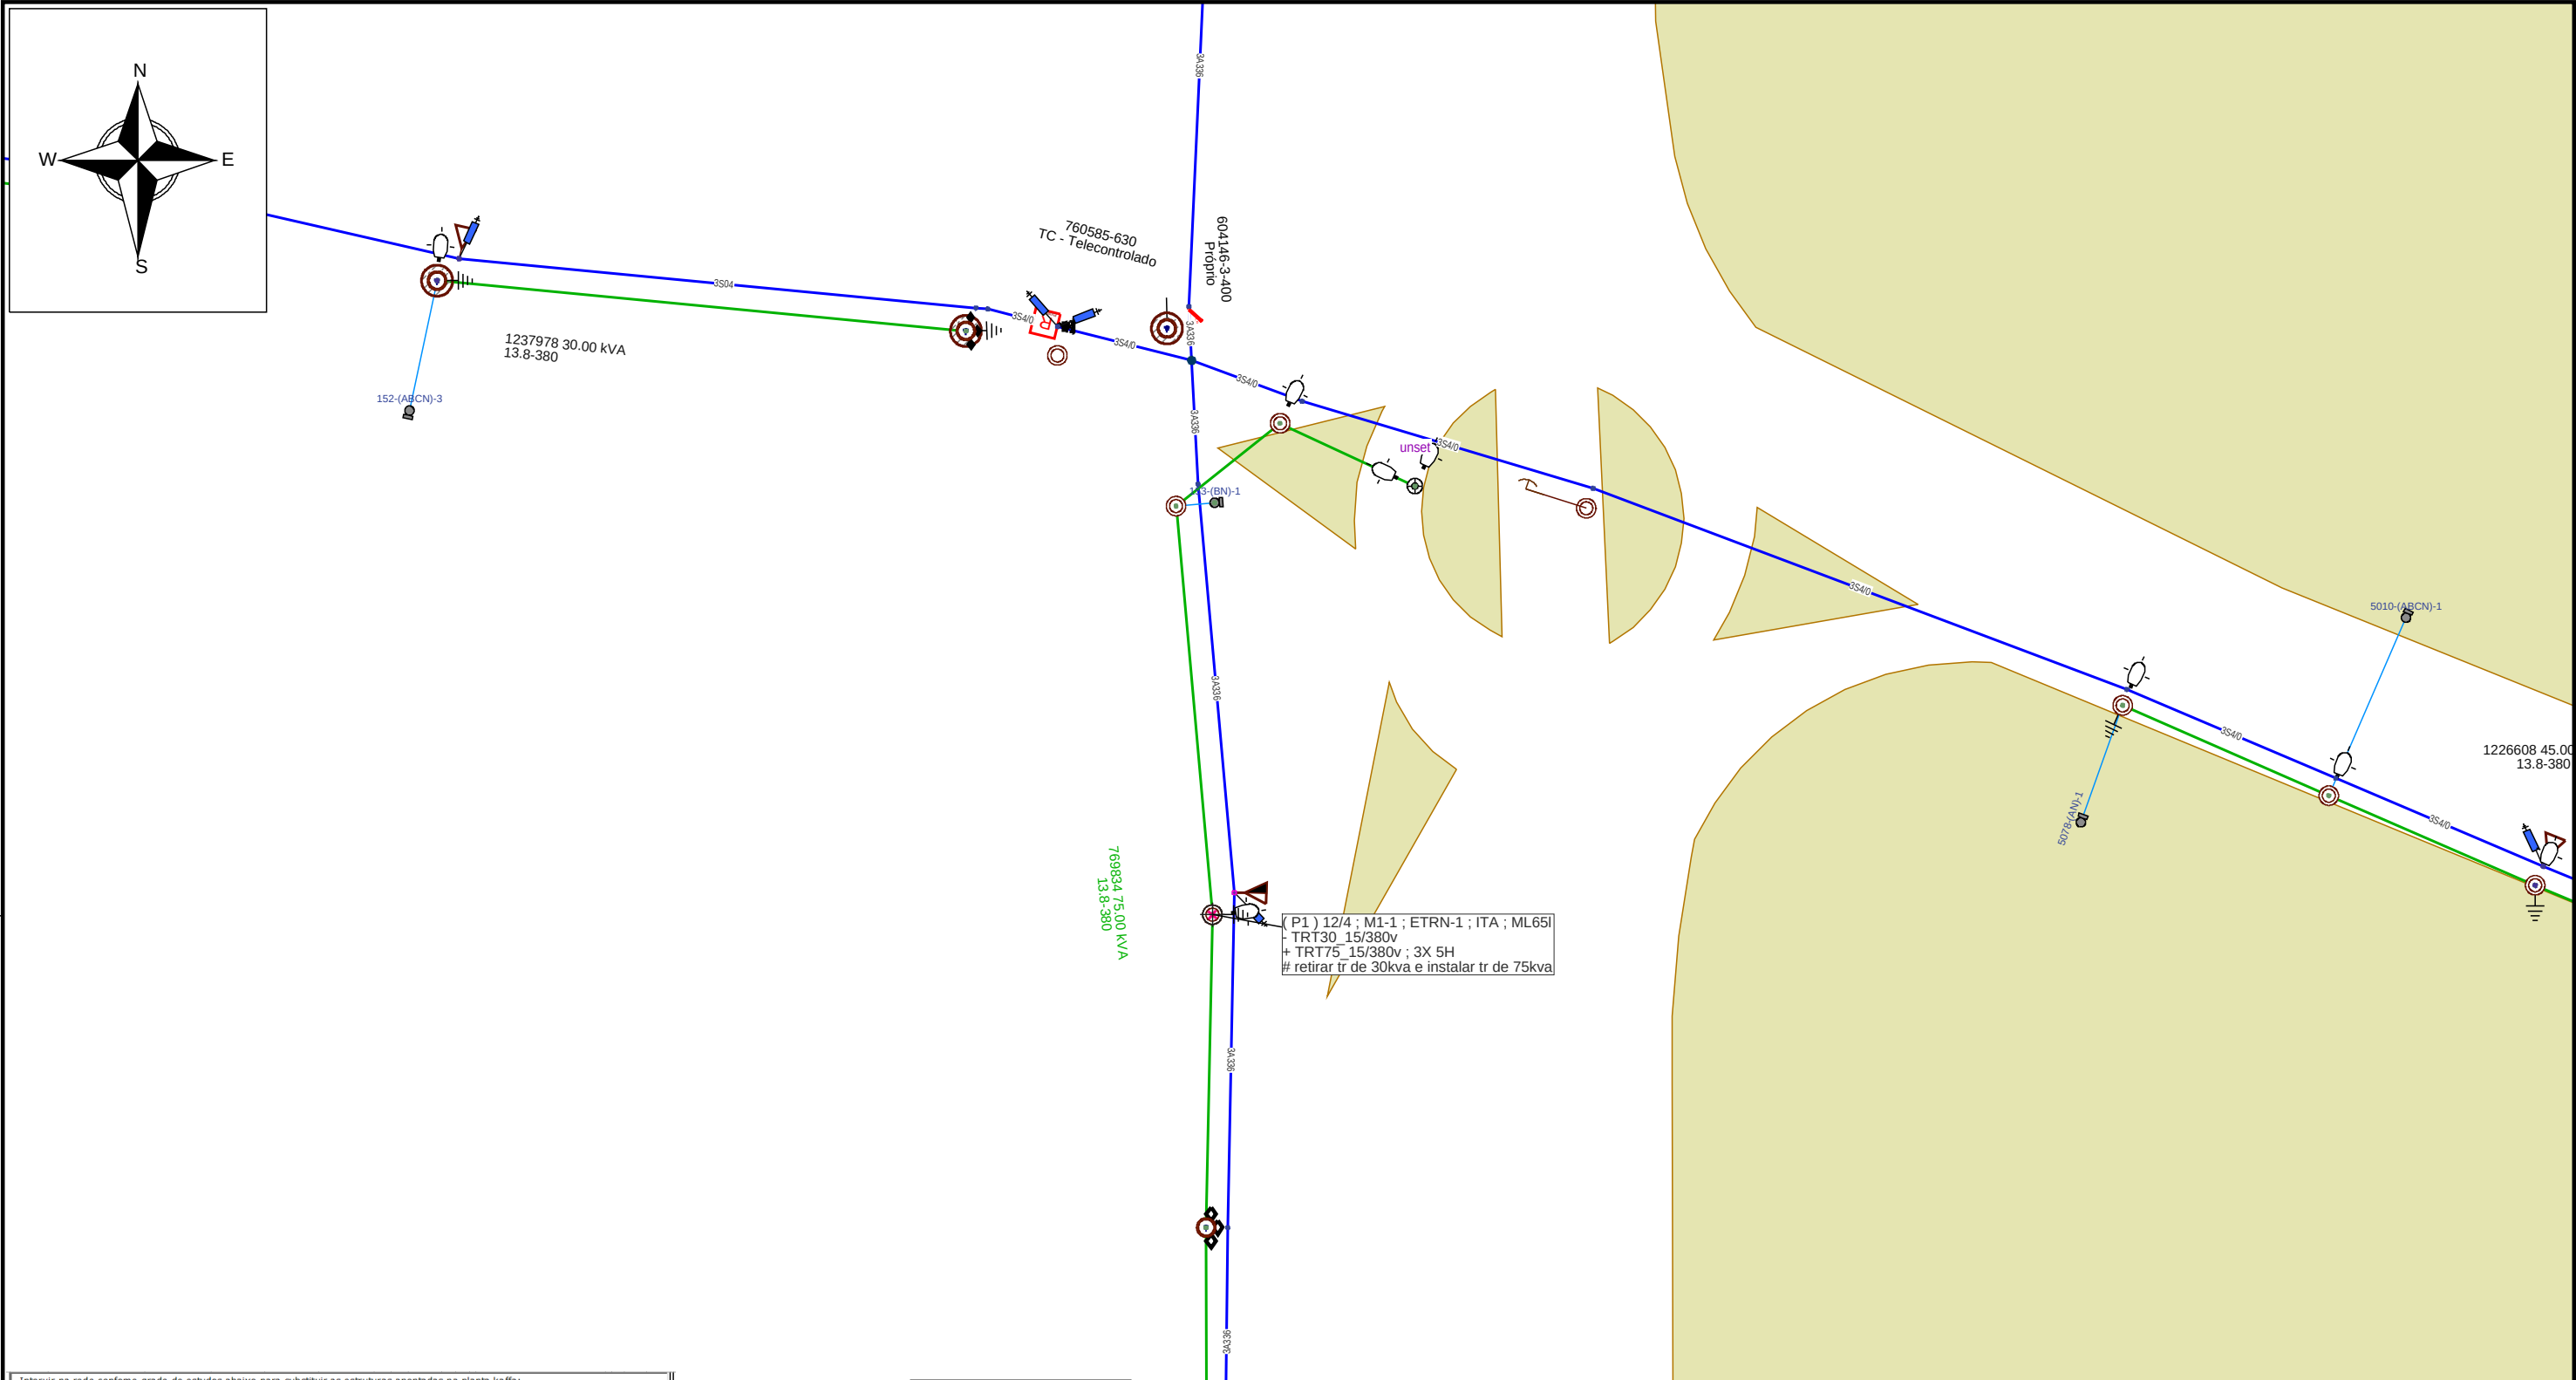

Intervir na rede conforme grade de estudos abaixo para substituir as estruturas apontadas na planta kaffa;

Se possível, na mesma programação podem ser executadas as seguintes notas 6470674,

O DEC EM ESTUDO PODE SER OIMIZADO EM ATÉ 0 CHI					Quantidade de equipes sugeridas para o desligamento	
Equipamento Desligado	Número Operativo	Clientes Desligados	Duração da intervenção	CHI Total	Observações (se necessário)	
TRANSFORMADOR	769834	4	5	20		
ESTUDO DE CHI					Total	20

RE: 0000212

Técnico: RICARDO QUEVEDO DE ALBUQUERQUE

Data da análise: 15/01/2024

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O GED 18968

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:

- # CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
- # FISSURAS;
- # APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Seja a mudança que você quer ver na segurança do trabalho.

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Henrique Silva Erguy Junior

Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP

Técnico de Análise Projetos I

CFT: 5287547404-9

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: 769834

Responsável Técnico:	Eng. Ederson Paulo Vogel	Escala: 1:850	Data: 10/12/2025	Nota: 000006914087
CREA: RS135794	ART: 10911826	Classe de isolamento: 15kV	AL: KCE25	Folha 1
		Projetista: henrique erguy	Projeto: 000007941262	Levantador ricardo
