




AUMENTO DE CARGA MT
SOLICITANTE: ESCOLA DE EDUCAO INFANTIL MB CAXIAS LTD
TEL: (54) 98106-4598
ENDEREÇO: R JACOB LUCHESI 2374
BAIRRO: STA CATARINA
CIDADE: CAXIAS DO SUL
UC REF: 3082913287
RAMAL DE ENTRADA: 4#150mm2
DISJUNTOR GERAL: 3x350A

(P1) 12/4 ; M1-1 ; 2IF
M2-1
+ CE3D(N-M)CFus-1 ; CEPAT(E70) ; 3PR-1 S/MO ; ET1H-C ; 25K ; ATS ; CELOSA-1g ; Operar Chaves
INSTALAR DERIVAÇÃO UM POUCO ~1,5M DO TOPO DO POSTE DEVIDO AO ESFORÇO APLICADO
NECESSÁRIO PARA MANTER POSTE EXISTENTE

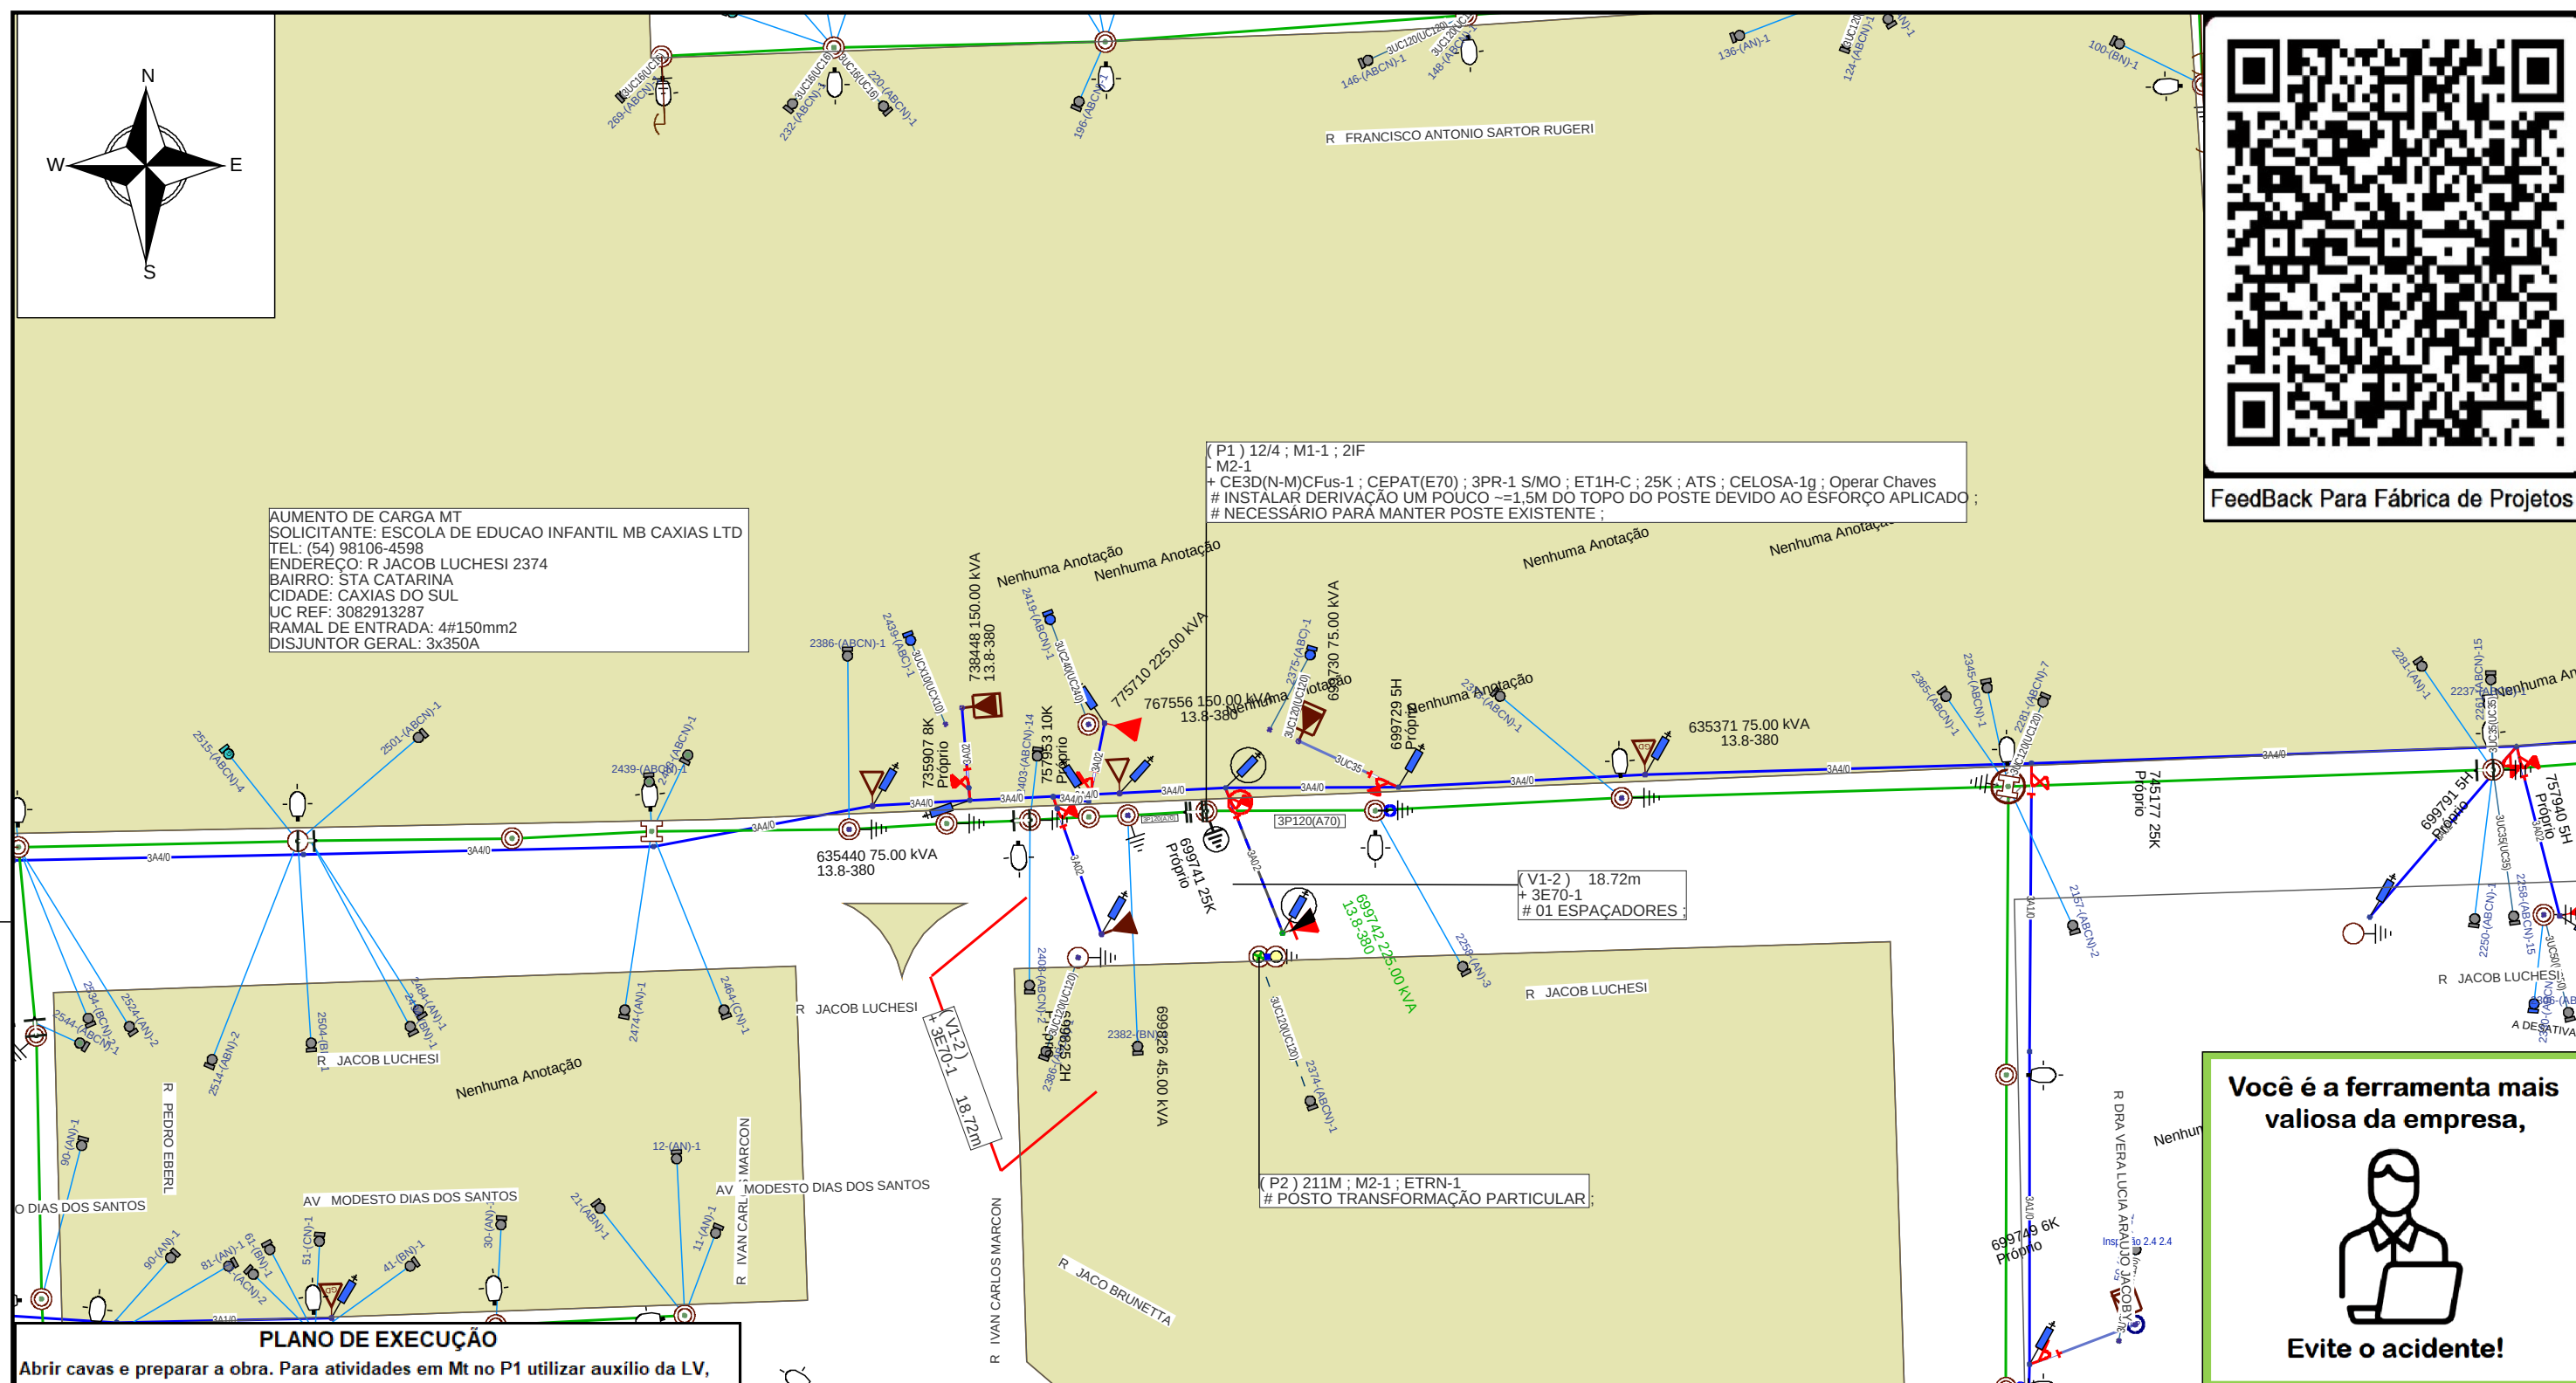

Evite o acidente!

PLANO DE EXECUÇÃO

Abrir cavas e preparar a obra. Para atividades em Mt no P1 utilizar auxílio da LV, demais atividades utilizar LM.


Planejado manobrar os equipamentos citados abaixo para execução da obra.
Previsto estender rede nova para atender aumento de carga.

Executar as atividades conforme projeto, demais alterações solicitar via D.I.

MO para manobras pagas em P1.

****EXECUTAR AS ATIVIDADES COM SEGURANÇA E CAPRICHOS.****

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	635371	19	5	95
Abrir	Transformador	767556	16	5	80
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		175



Marcelo Machado

Marcelo da Fontoura Machado

Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP

Técnico de Análise e Projetos

CFT: 054.031.390-44



Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MB CAXIAS LTDA

Obra: AUMENTO DE CARGA MT

Endereço: R JACOB LUCHESI 2374 95032-000 CAXIAS DO SUL BR RS

Responsável Técnico:

Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 1091182

Escala: 1:800

	Data: 09/09/2025
--	------------------

Nota:	300001079278
-------	--------------

Classe de isolamento:	
-----------------------	--

AL: KCE23

Folha 1

Projeto	Projeto de Engenharia de Software
Projetista:	Marcelo Machado

Projeto: 000007873837

	Levantador: Alessandro Oliveira
--	---------------------------------
