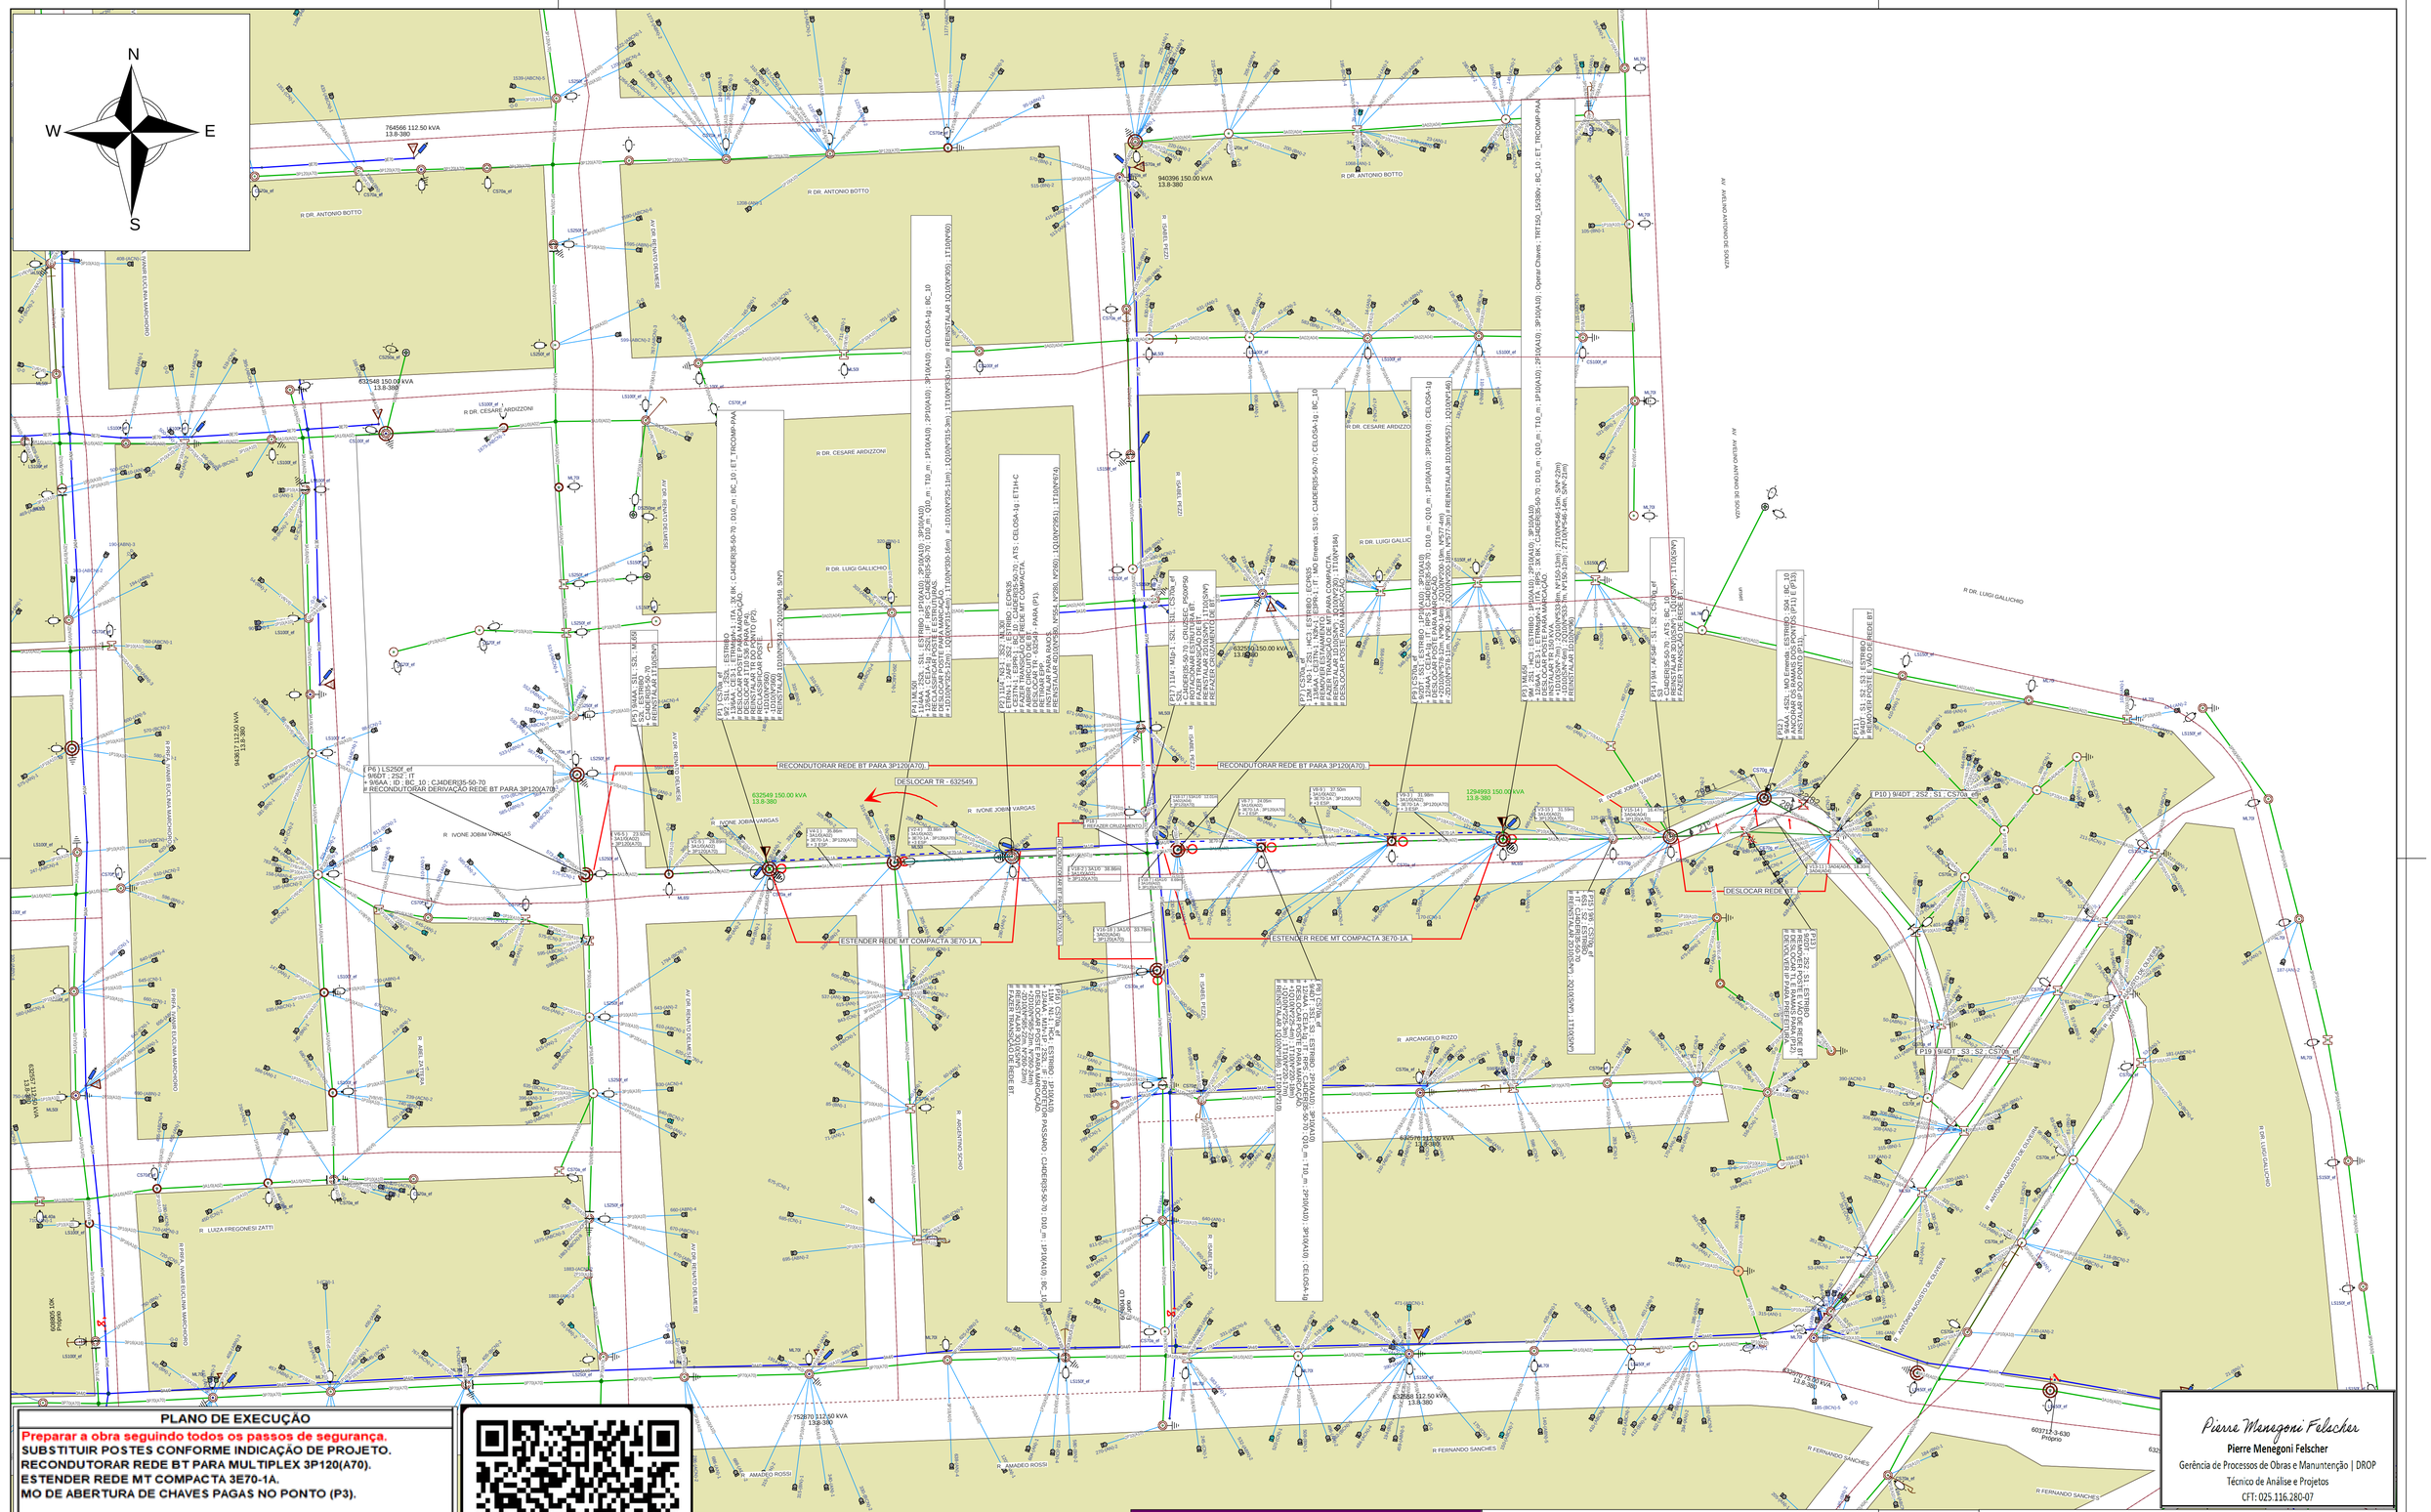

PLANO DE EXECUÇÃO

Preparar a obra seguindo todos os passos de segurança.
SUBSTITUIR POSTES CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO.
RECONDUTORAR REDE BT PARA MULTIPLEX 3P120(A70).
ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A.
MO DE ABERTURA DE CHAVES PAGAS NO PONTO (P3).

ESSE PROJETO SÓ PODE SER ALTERADO POR SOLICITAÇÃO DE DI.
MANOBRAR EQUIPAMENTO ABAIXO PRA REALIZAR PROCEDIMENTO.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusivel	608804	356	5	1780
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		1780

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

CAPRICHO É A GARANTIA DE NÃO PRECISAR FAZER A MESMA COISA DUAS VEZES!

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Pierre Menegoni Felscher
Pierre Menegoni Felscher
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 025.116.280-07

CPFL ENERGIA

Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: R ISABEL PEZZI, 585 - NS DE FATIMA - CAXIAS DO SUL

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 01/07/2025	Nota: 000006783051
Classe de isolação: 15kV	AL: KCS25	Folha 1
Projetista: Pierre Felscher	Projeto: 000007825542	Levantador: MÁRCIO BEDIN
