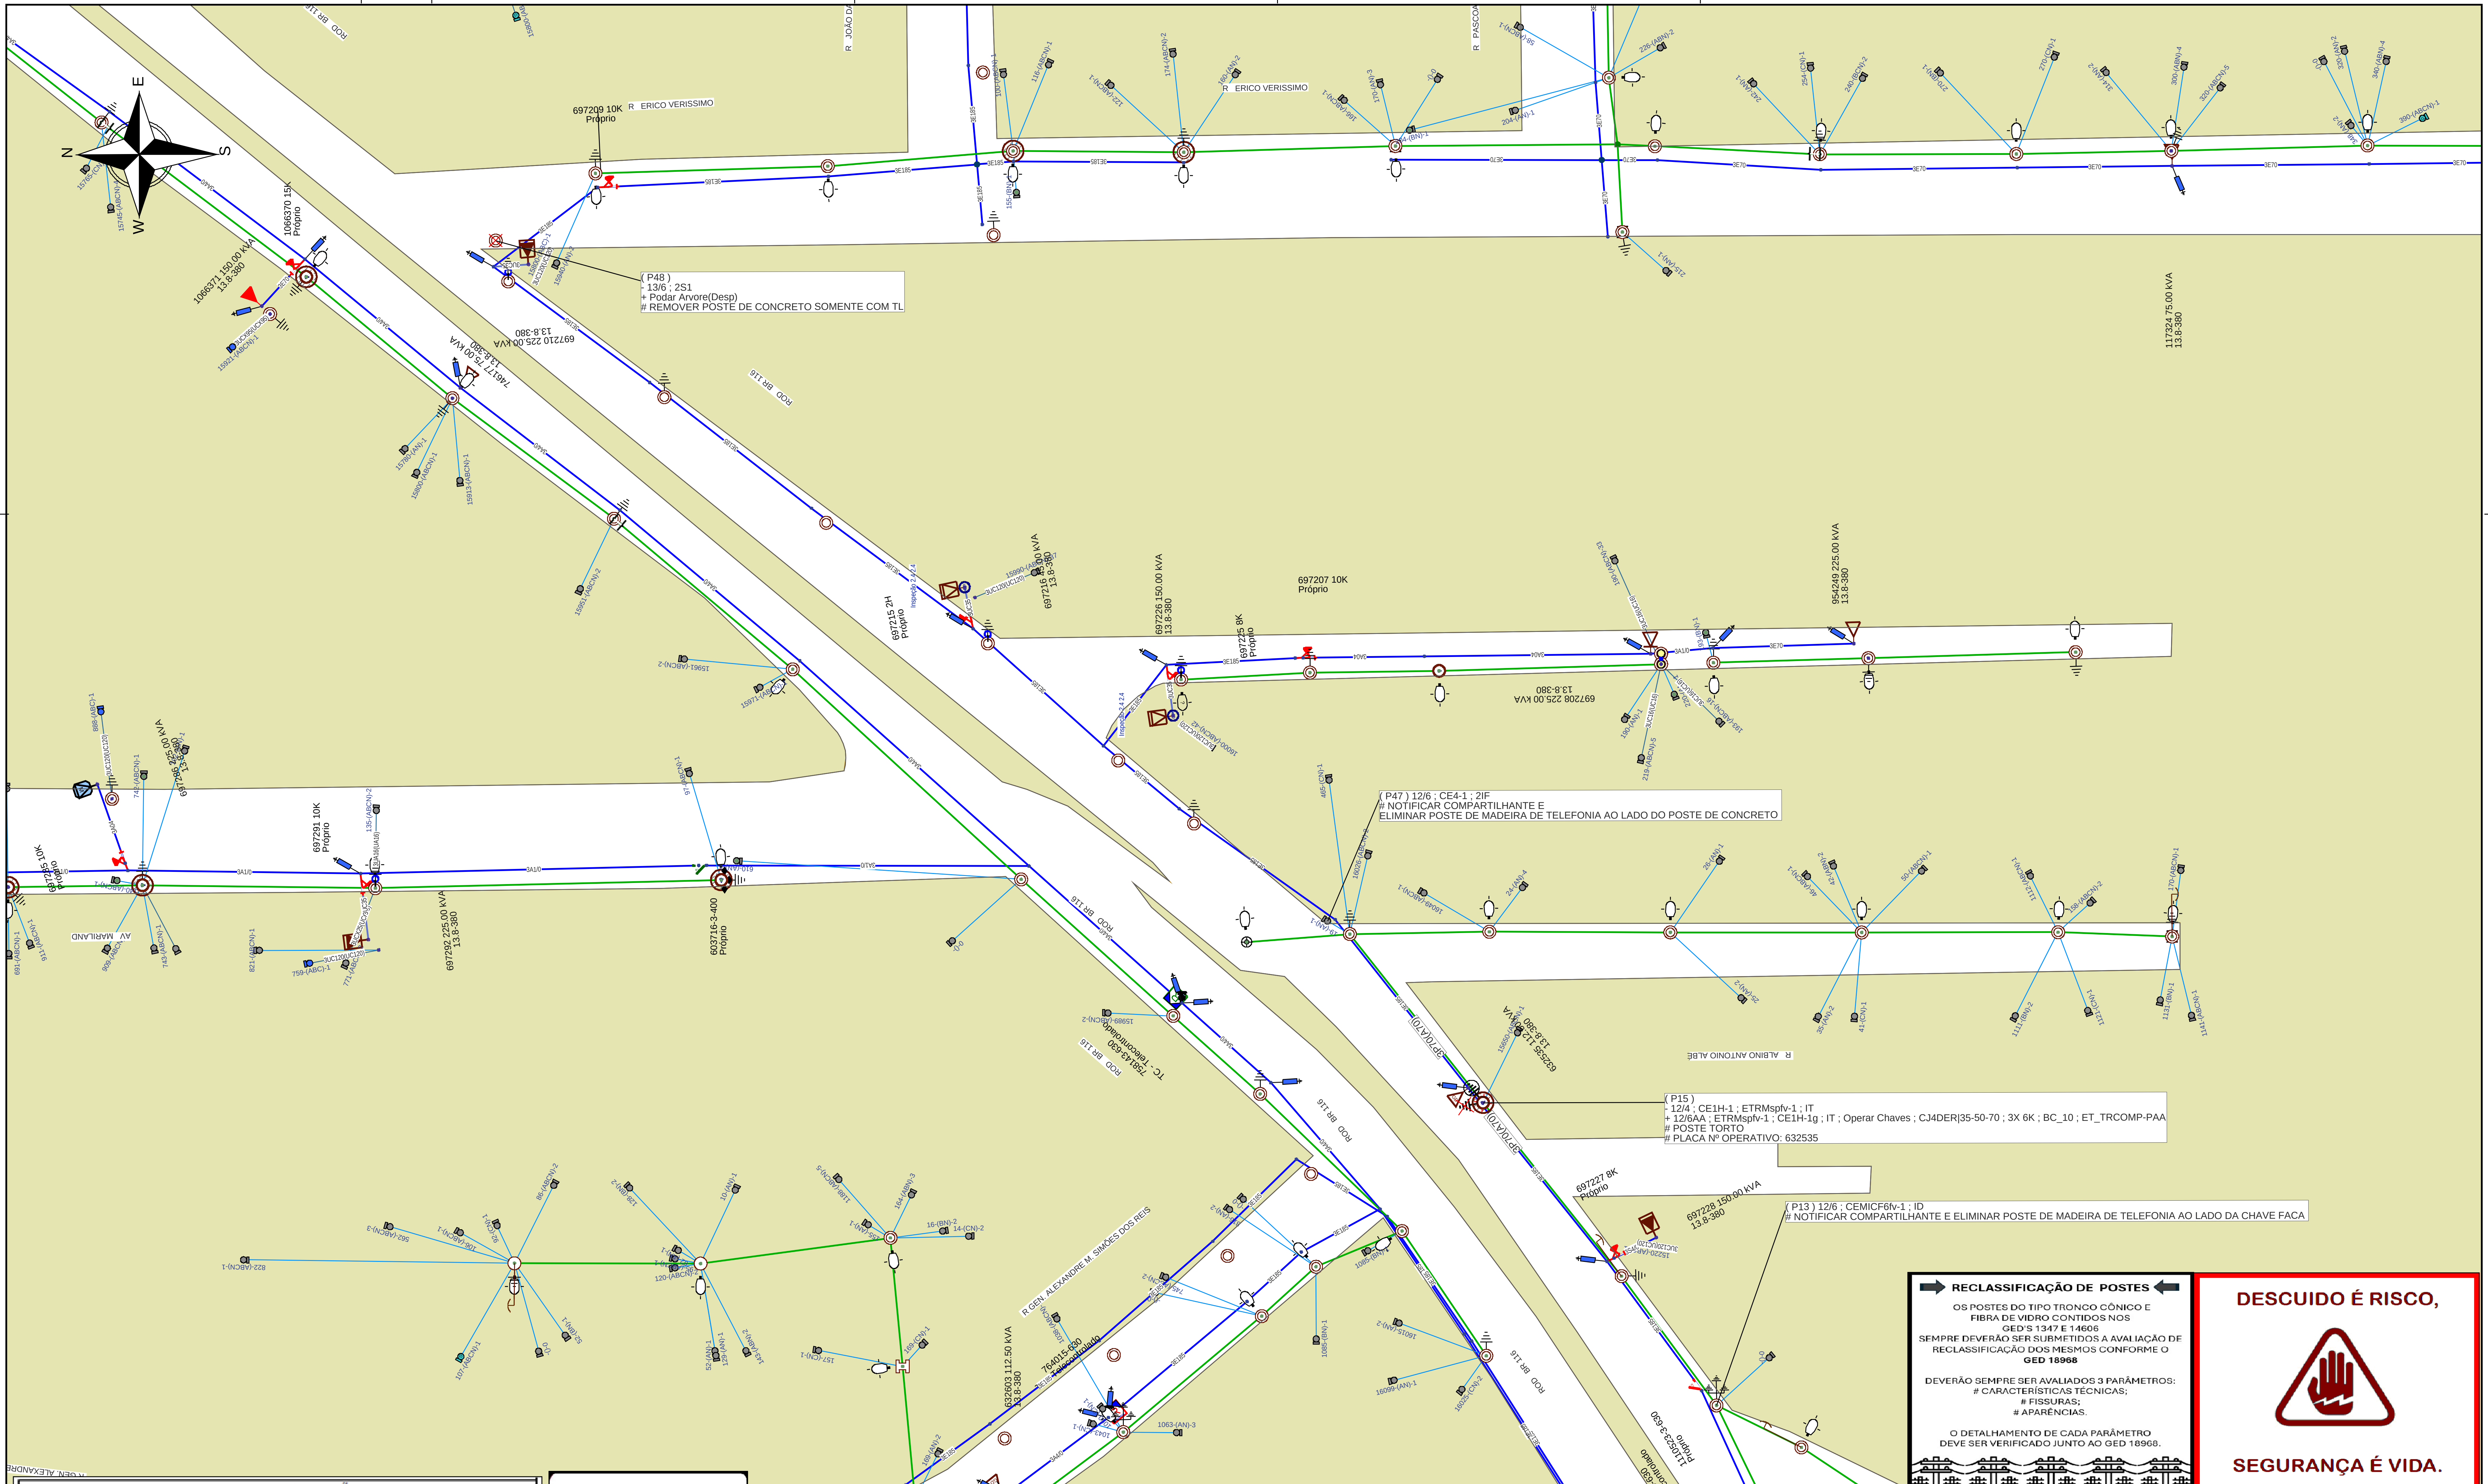

PLANO DE EXECUÇÃO

Executar a obra seguindo todos os passos de segurança!

SUBSTITUIR POSTES INDICADOS EM PLANTA SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Faca	1110523	193	4	772
Abrir	Chave Faca	603702			
Fechar	Religador	1132421			
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		772

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

DESCUIDO É RISCO,

SEGURANÇA É VIDA.

Planeje / Use / Teste / Sinalize / Aterre

Breno Ardenghy

Breno Ardenghy Da Silva
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 03188101074

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: EST FEDERAL BR 116 15650 S CIRO CAXIAS DO SUL

Responsável Técnico:	Escala: 1:850	Data: 01/04/2025	Nota: 000006790906
Eng. Ederson Paulo Vogel	Classe de isolação: 15kV	AL: KCS26	Folha 1
CREA: RS135794 ART: 10911826	Projetista: BRENO ARDENGHY	Projeto: 000007757483	Levantador: REINHOLDO BRULINGER
