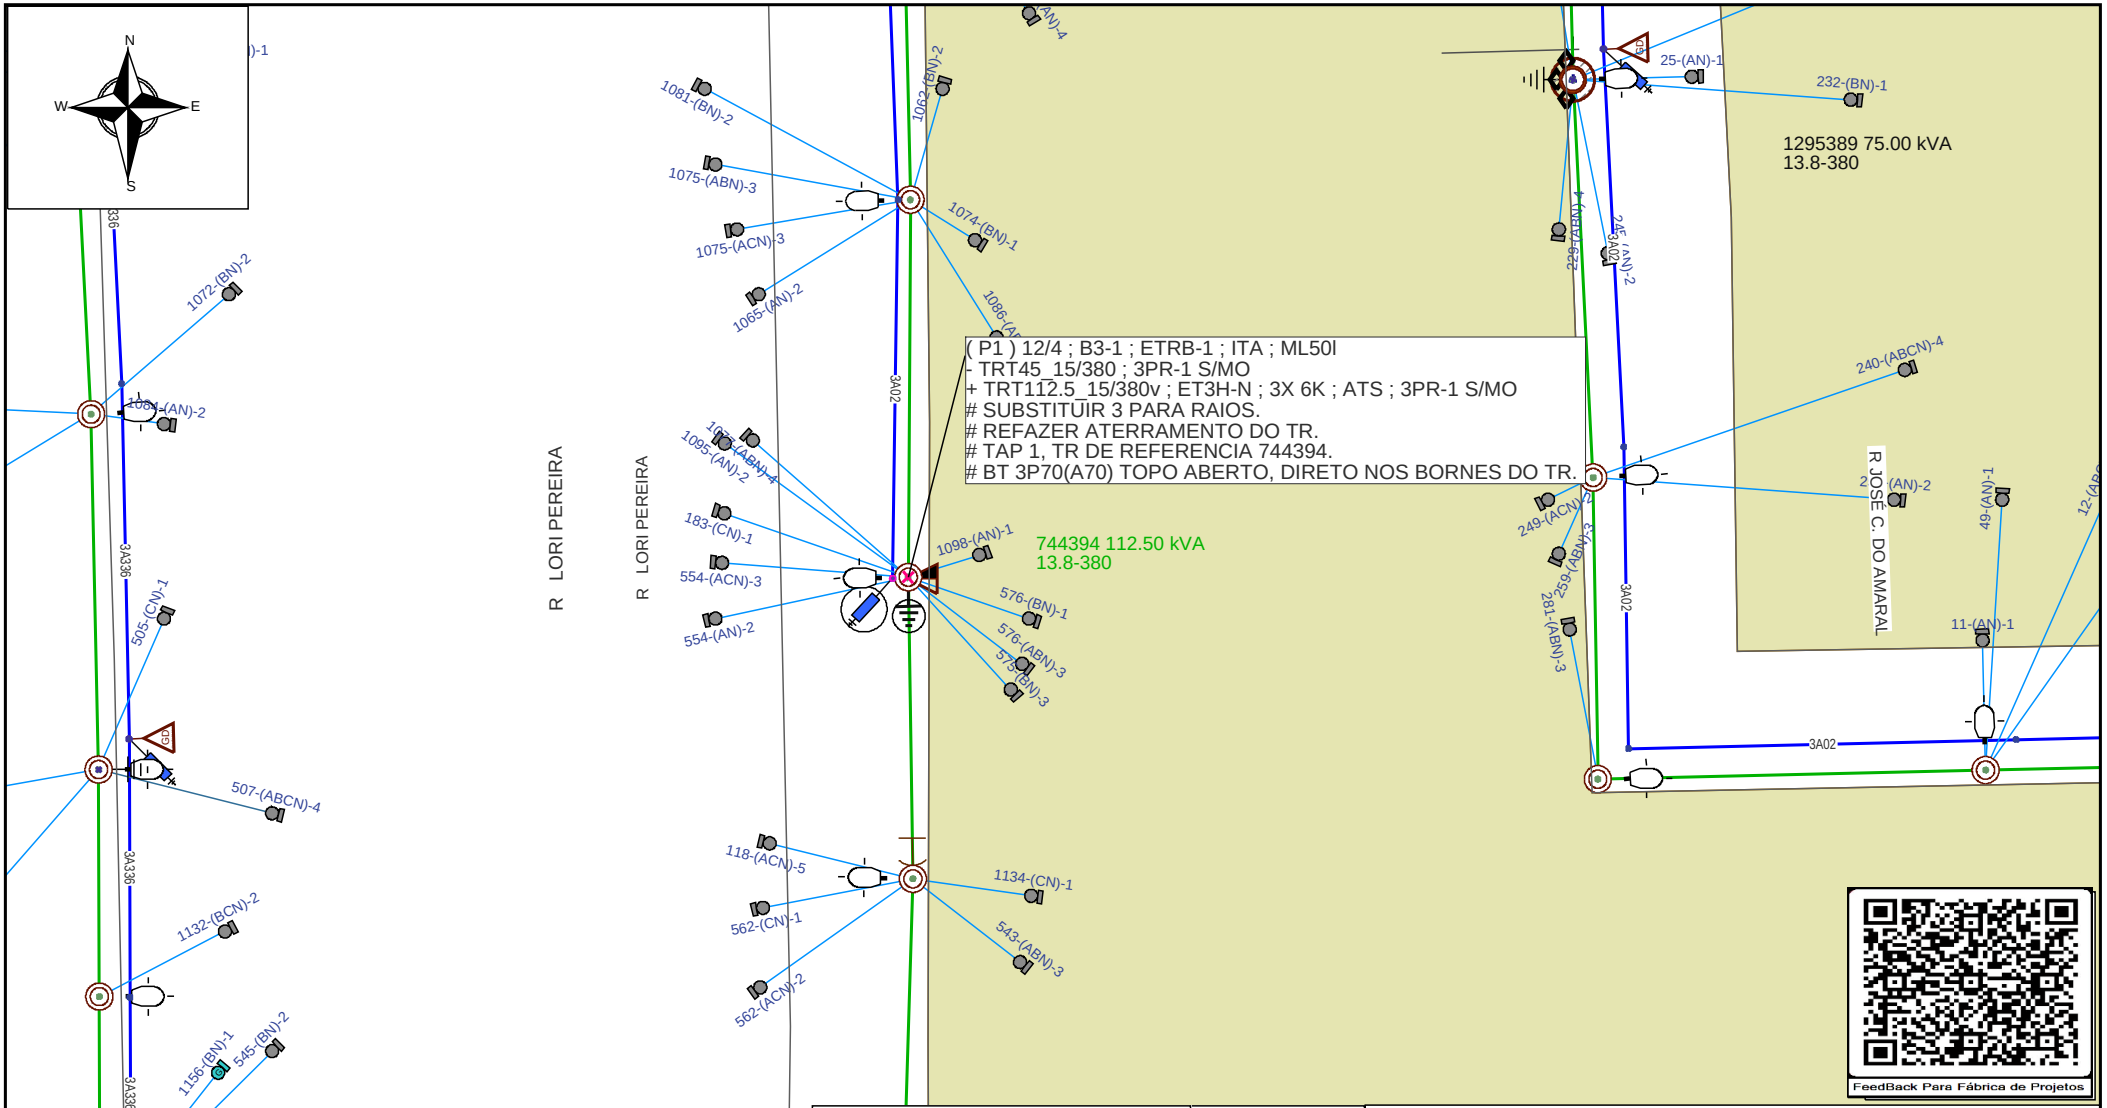

PLANO DE EXECUÇÃO

EXECUTAR ATIVIDADES COM SEGURANÇA!

SUBSTITUIR TR DE 45 POR OUTRO DE 112.5KVA E OS PARA RAIOS.

DESLIGAR A CH FUSÍVEL DA ETRN E ABRIR OS GLVS P/

DESENERGIZAR O EQUIPAMENTO TR.

EXECUTAR ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO. ALTERAÇÕES, SOLICITAR D. I.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	744394	76	4	304
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		304

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Edson Dilmar Papalia Flores
Edson Dilmar Papalia Flores
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 220.942.817-3

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Obra: Plano Sobrecarga 2026

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Endereço: R LORI PEREIRA, 554, CAXIAS DO SUL, RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:700	Data: 20/02/2026	Nota: 000006954706
Classe de isolação: 15kV	AL: CXD24	Folha 1
Projetista: EDSON PAPALIA	Projeto: 000007984603	Levantador: ADELAR FERREIRA
