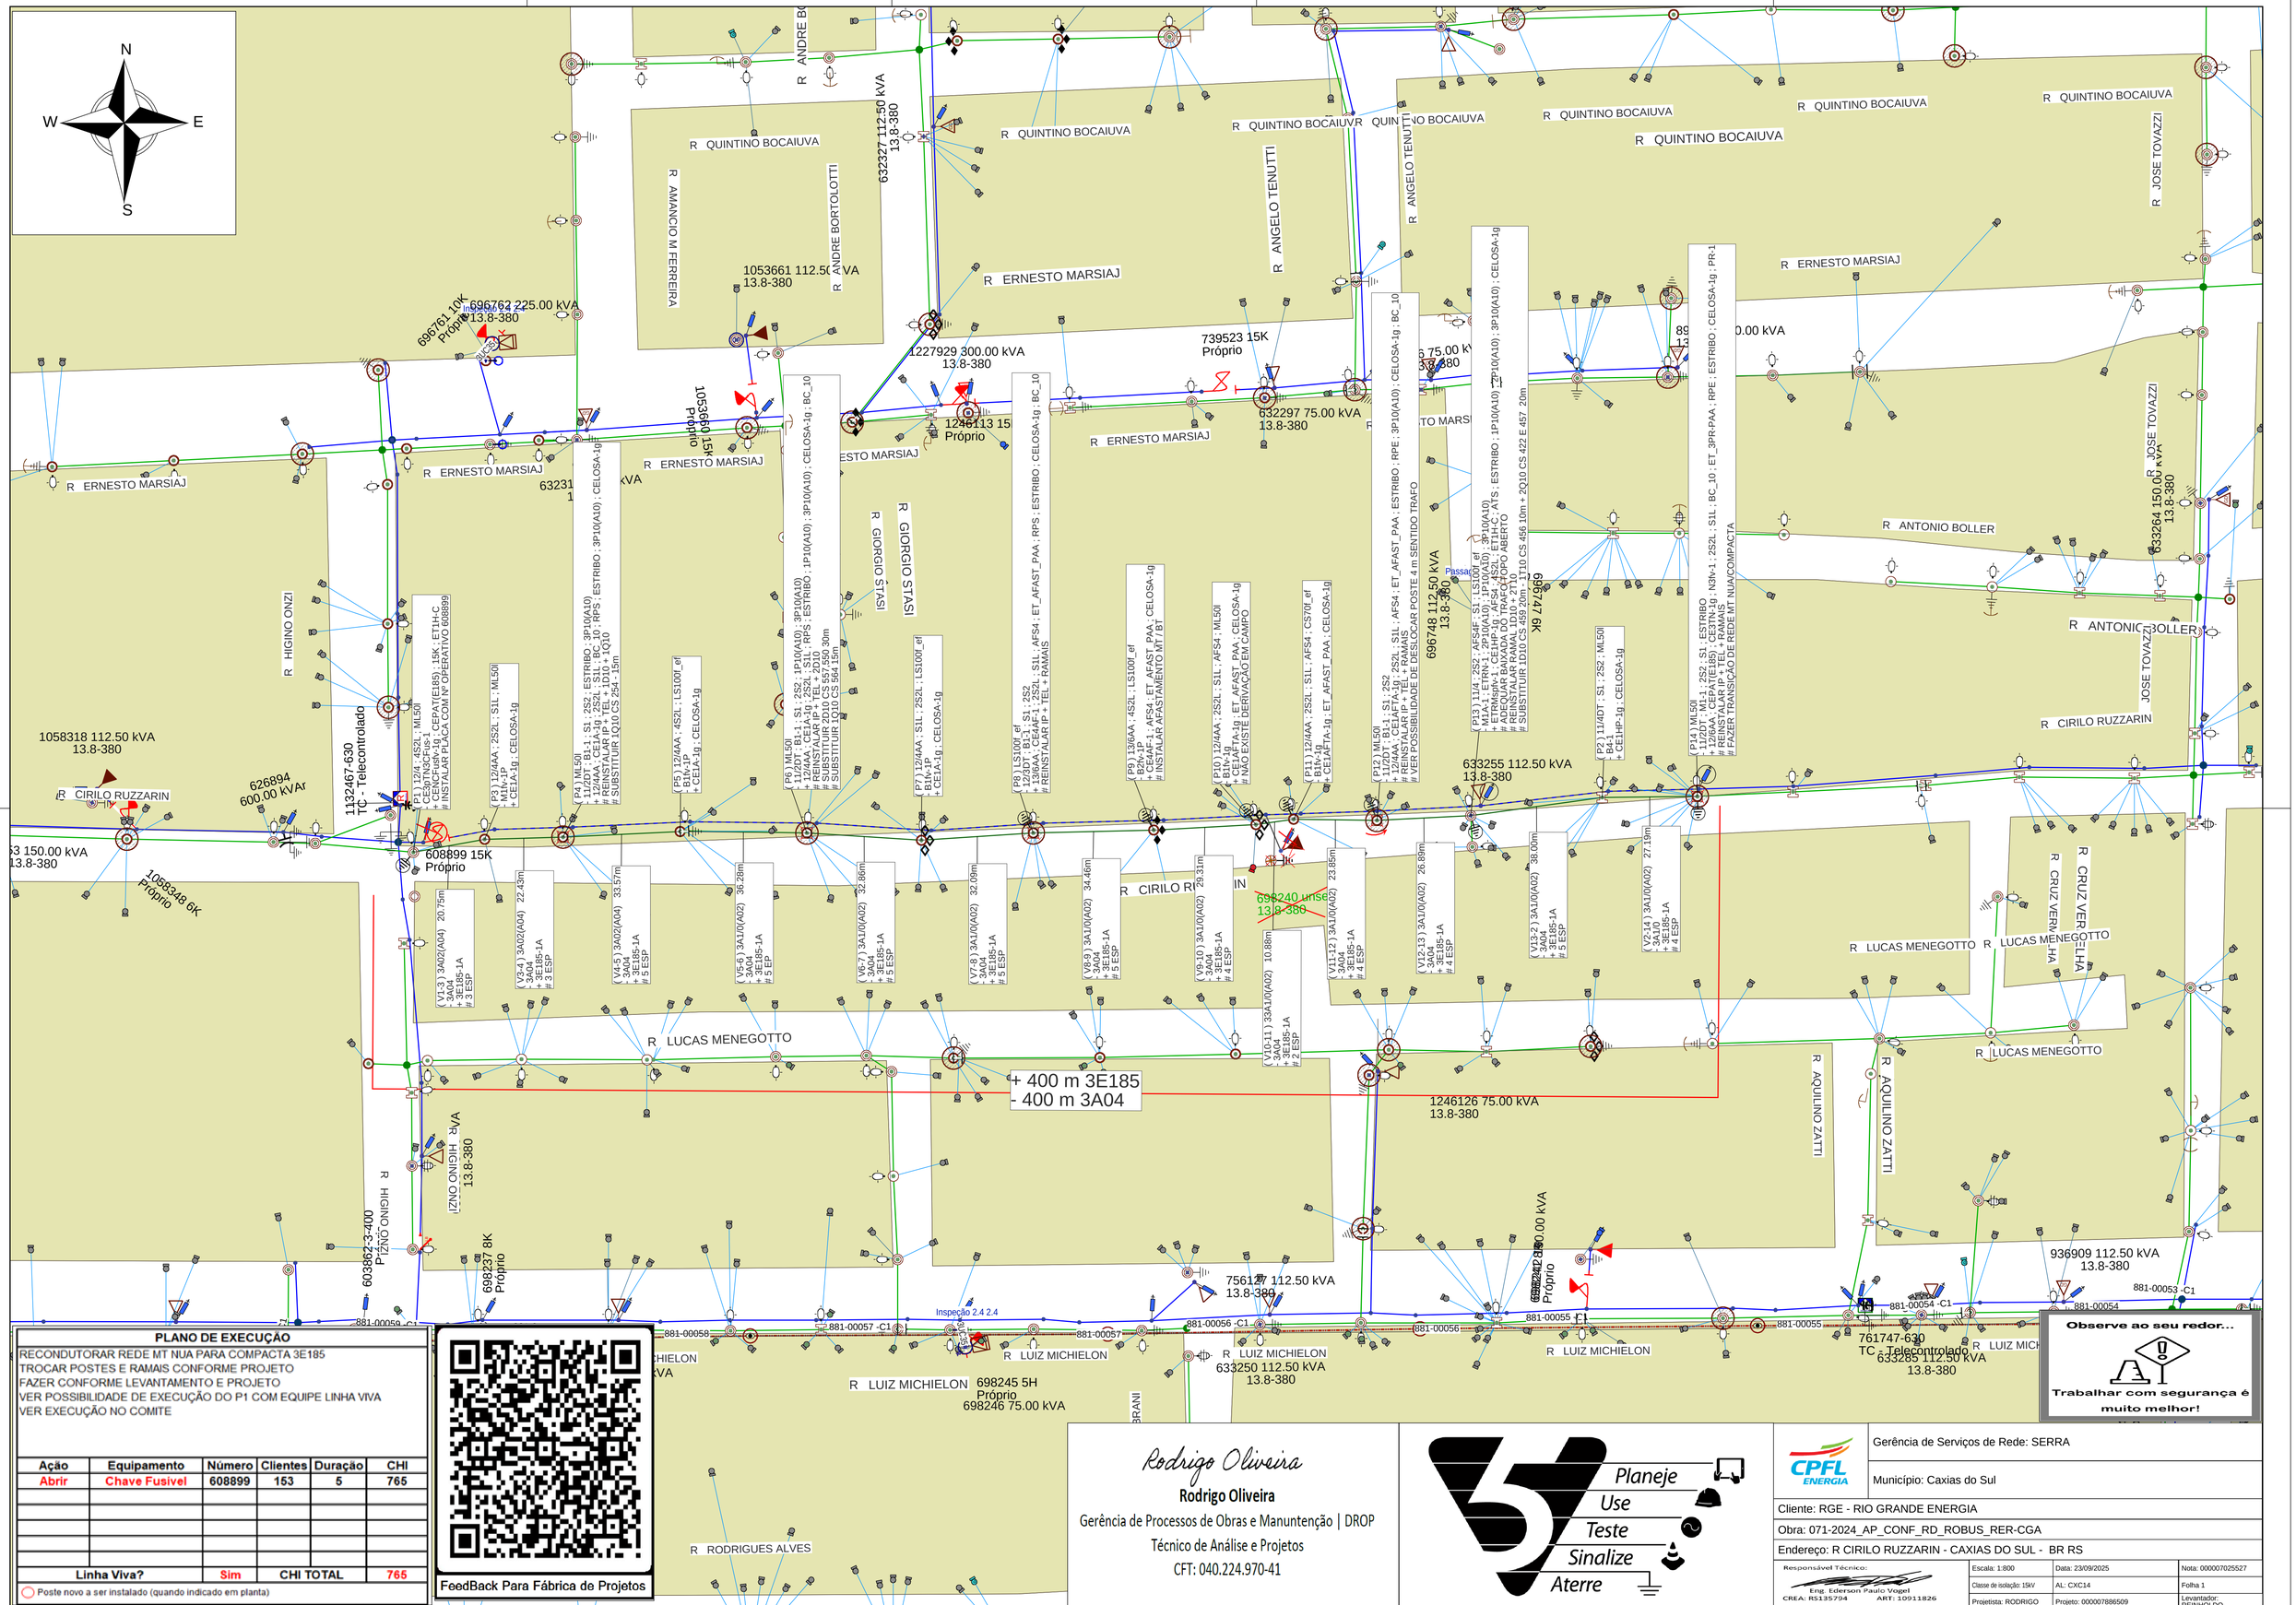

PLANO DE EXECUÇÃO

RECONDUTORAR REDE MT NUA PARA COMPACTA 3E185
TROCAR POSTES E RAMAIS CONFORME PROJETO
FAZER CONFORME LEVANTAMENTO E PROJETO
VER POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO P1 COM EQUIPE LINHA VIVA
VER EXECUÇÃO NO COMITE

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusível	608899	153	5	765
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		765

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Rodrigo Oliveira
Rodrigo Oliveira
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 040.224.970-41

Planeje Use Teste Sinalize Aterre

CPFL ENERGIA

Gerência de Serviços de Rede: SERRA
Município: Caxias do Sul
Cliente: RGE - RIO GRANDE ENERGIA
Obra: 071-2024_AP_CONF_RD_ROBUS_RER-CGA
Endereço: R CIRILO RUZZARIN - CAXIAS DO SUL - BR RS

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:800	Data: 23/09/2025	Nota: 000007025527
Classe de isolação: 15kV	AL: CXC14	Folha 1
Projetista: RODRIGO	Projeto: 000007886509	Levantador: REINHOLDO
