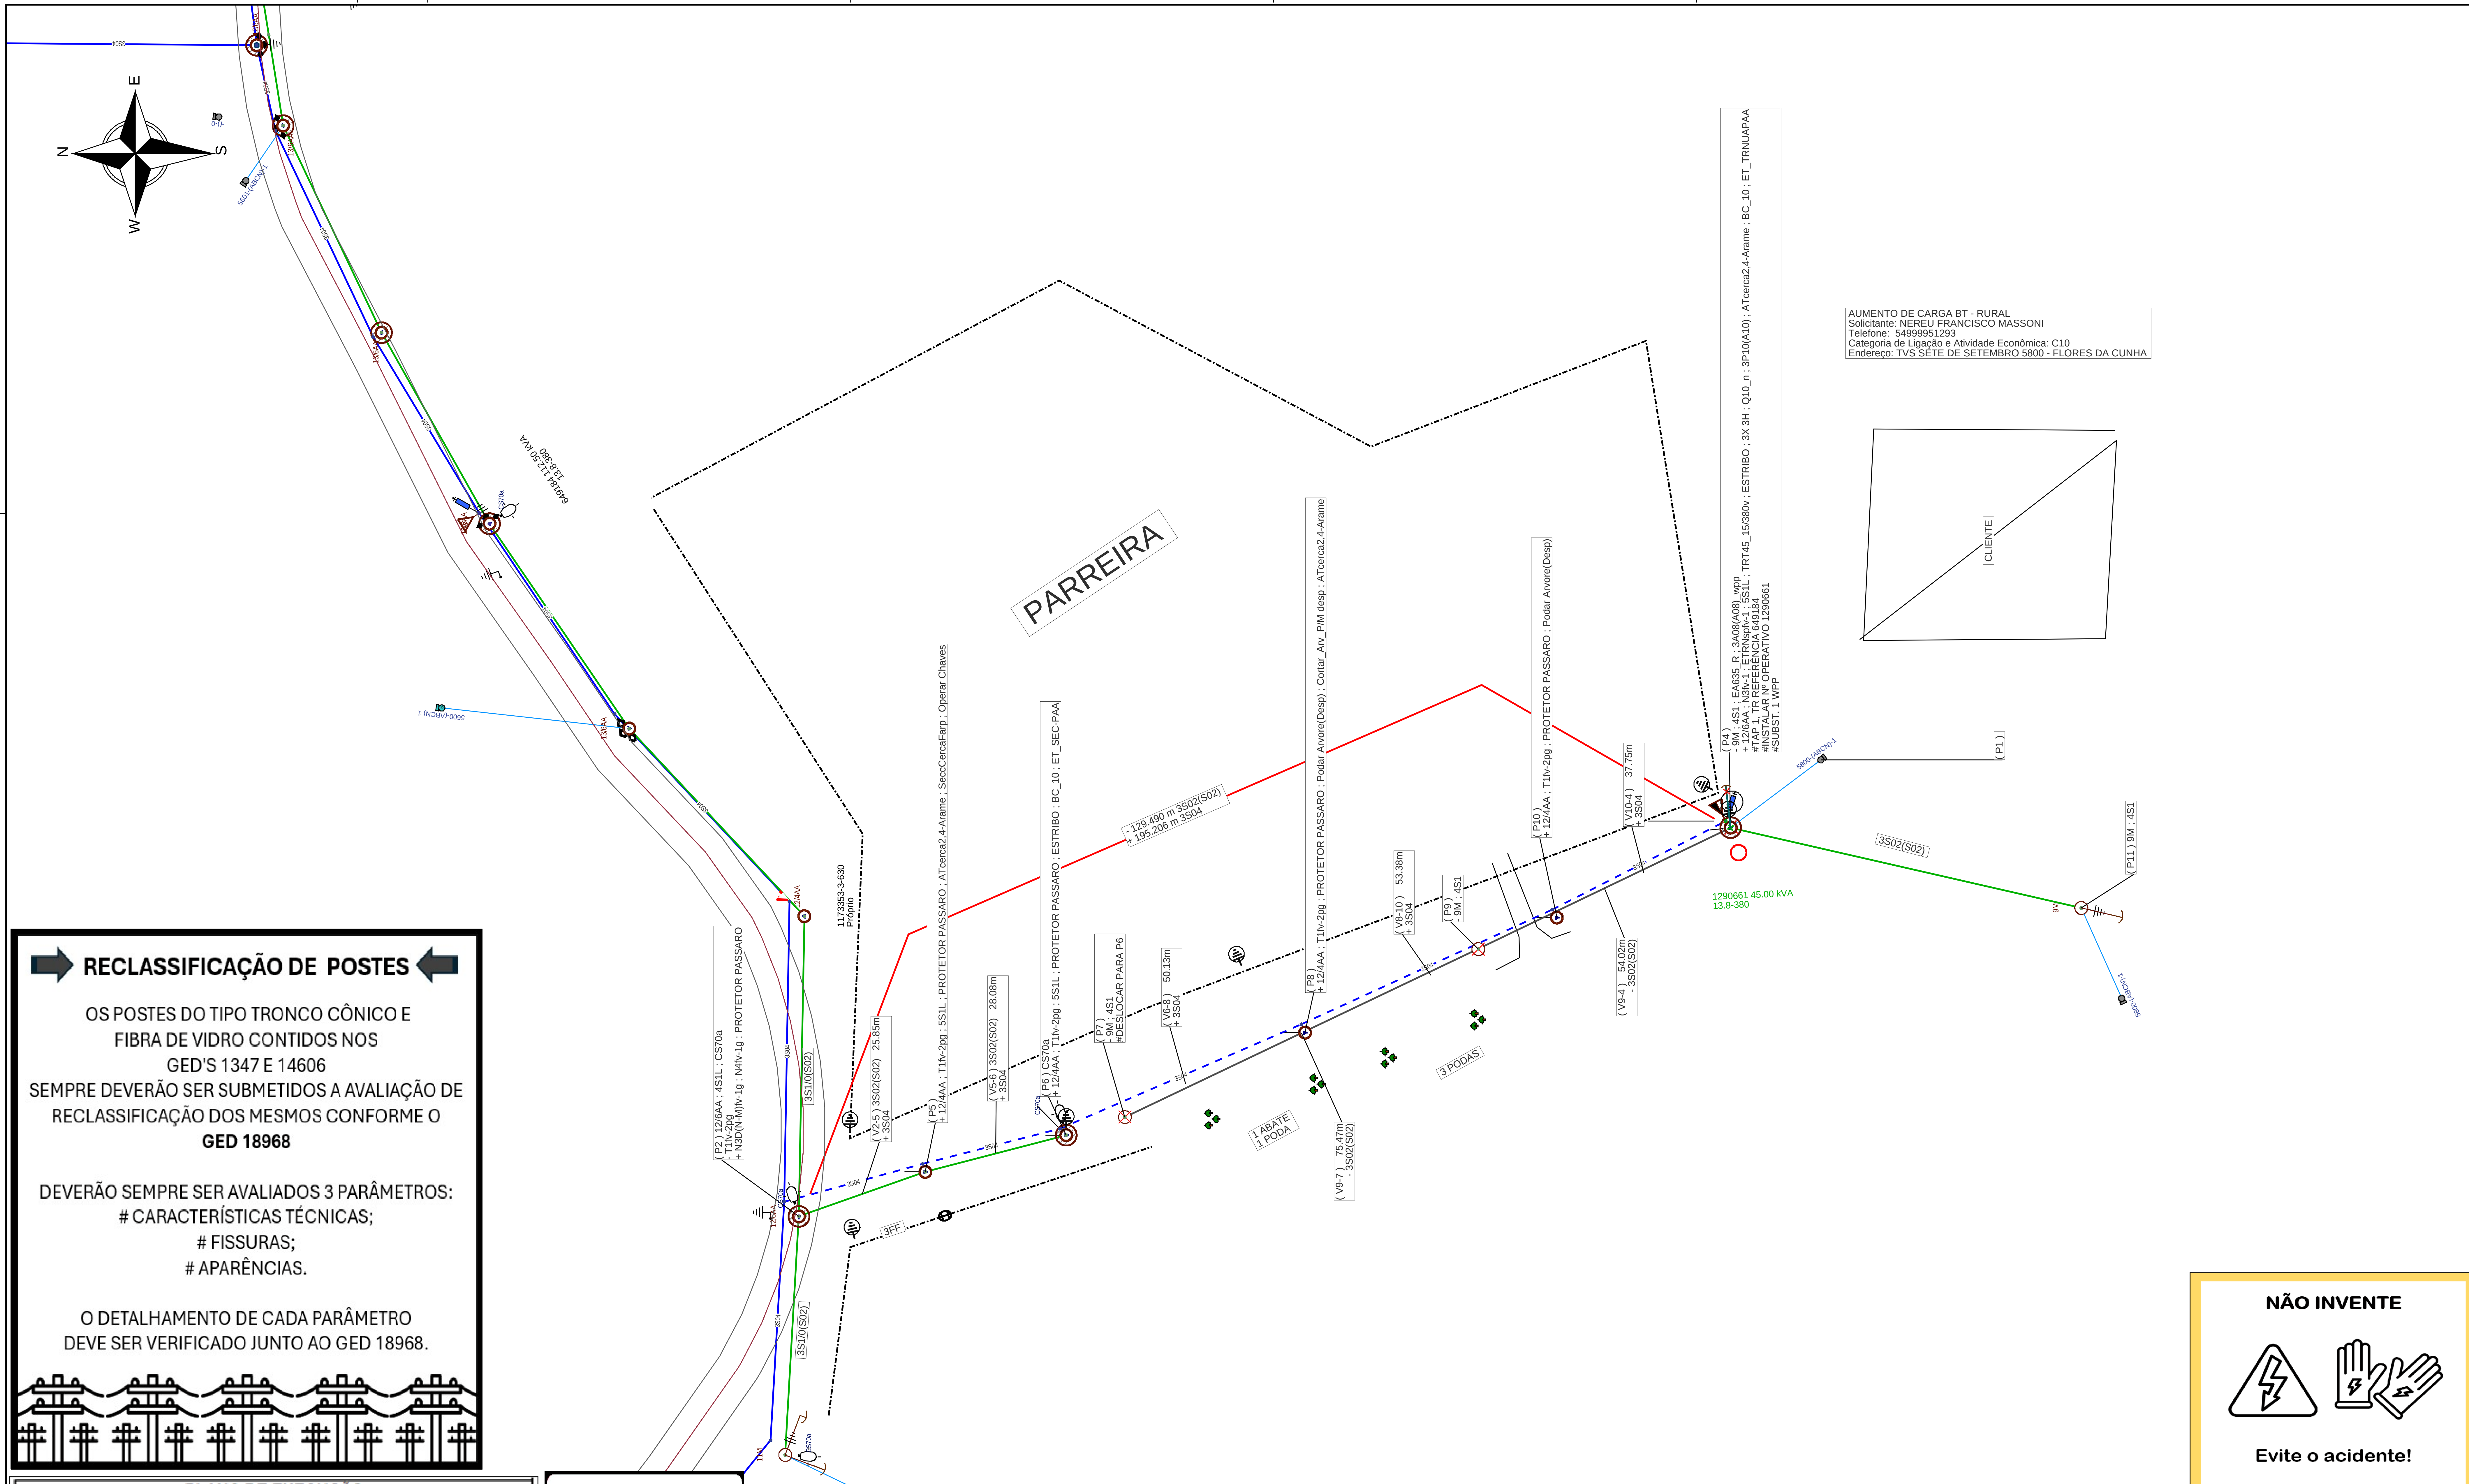


➡ RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES ⬅

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E
FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS
GED'S 1347 E 14606
SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE
RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O
GED 18968

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO
DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

PLANO DE EXECUÇÃO

Preparar obra, estender rede MT de P2 a P4 e instalar TR 45kVA.
Retirar rede de BT de P7 a P4.
Executar P2 com LV.

Executar as atividades com segurança e excelência.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	649184	7	6	42
					0
					0
					0
					0
					0
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		42

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

NÃO INVENTE

Evite o acidente!

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Vitor Vinícius N. de Araujo
Vitor Vinícius Nascimento de Araujo
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 142.814.127-86

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Flores da Cunha

Cliente: NEREU FRANCISCO MASSONI

Obra: ALTERAÇÃO DE FASE BT - RURAL

Endereço: TVS SETE DE SETEMBRO 5800 95270-000 FLORES DA CUNHA BR RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 06/10/2025	Nota: 300001085976
Classe de isolação: 15kV	AL: FCU14	Folha 1
Projetista: Vitor Vinícius	Projeto: 000007895441	Levantador: Ricardo Quevedo de Albuquerqe
