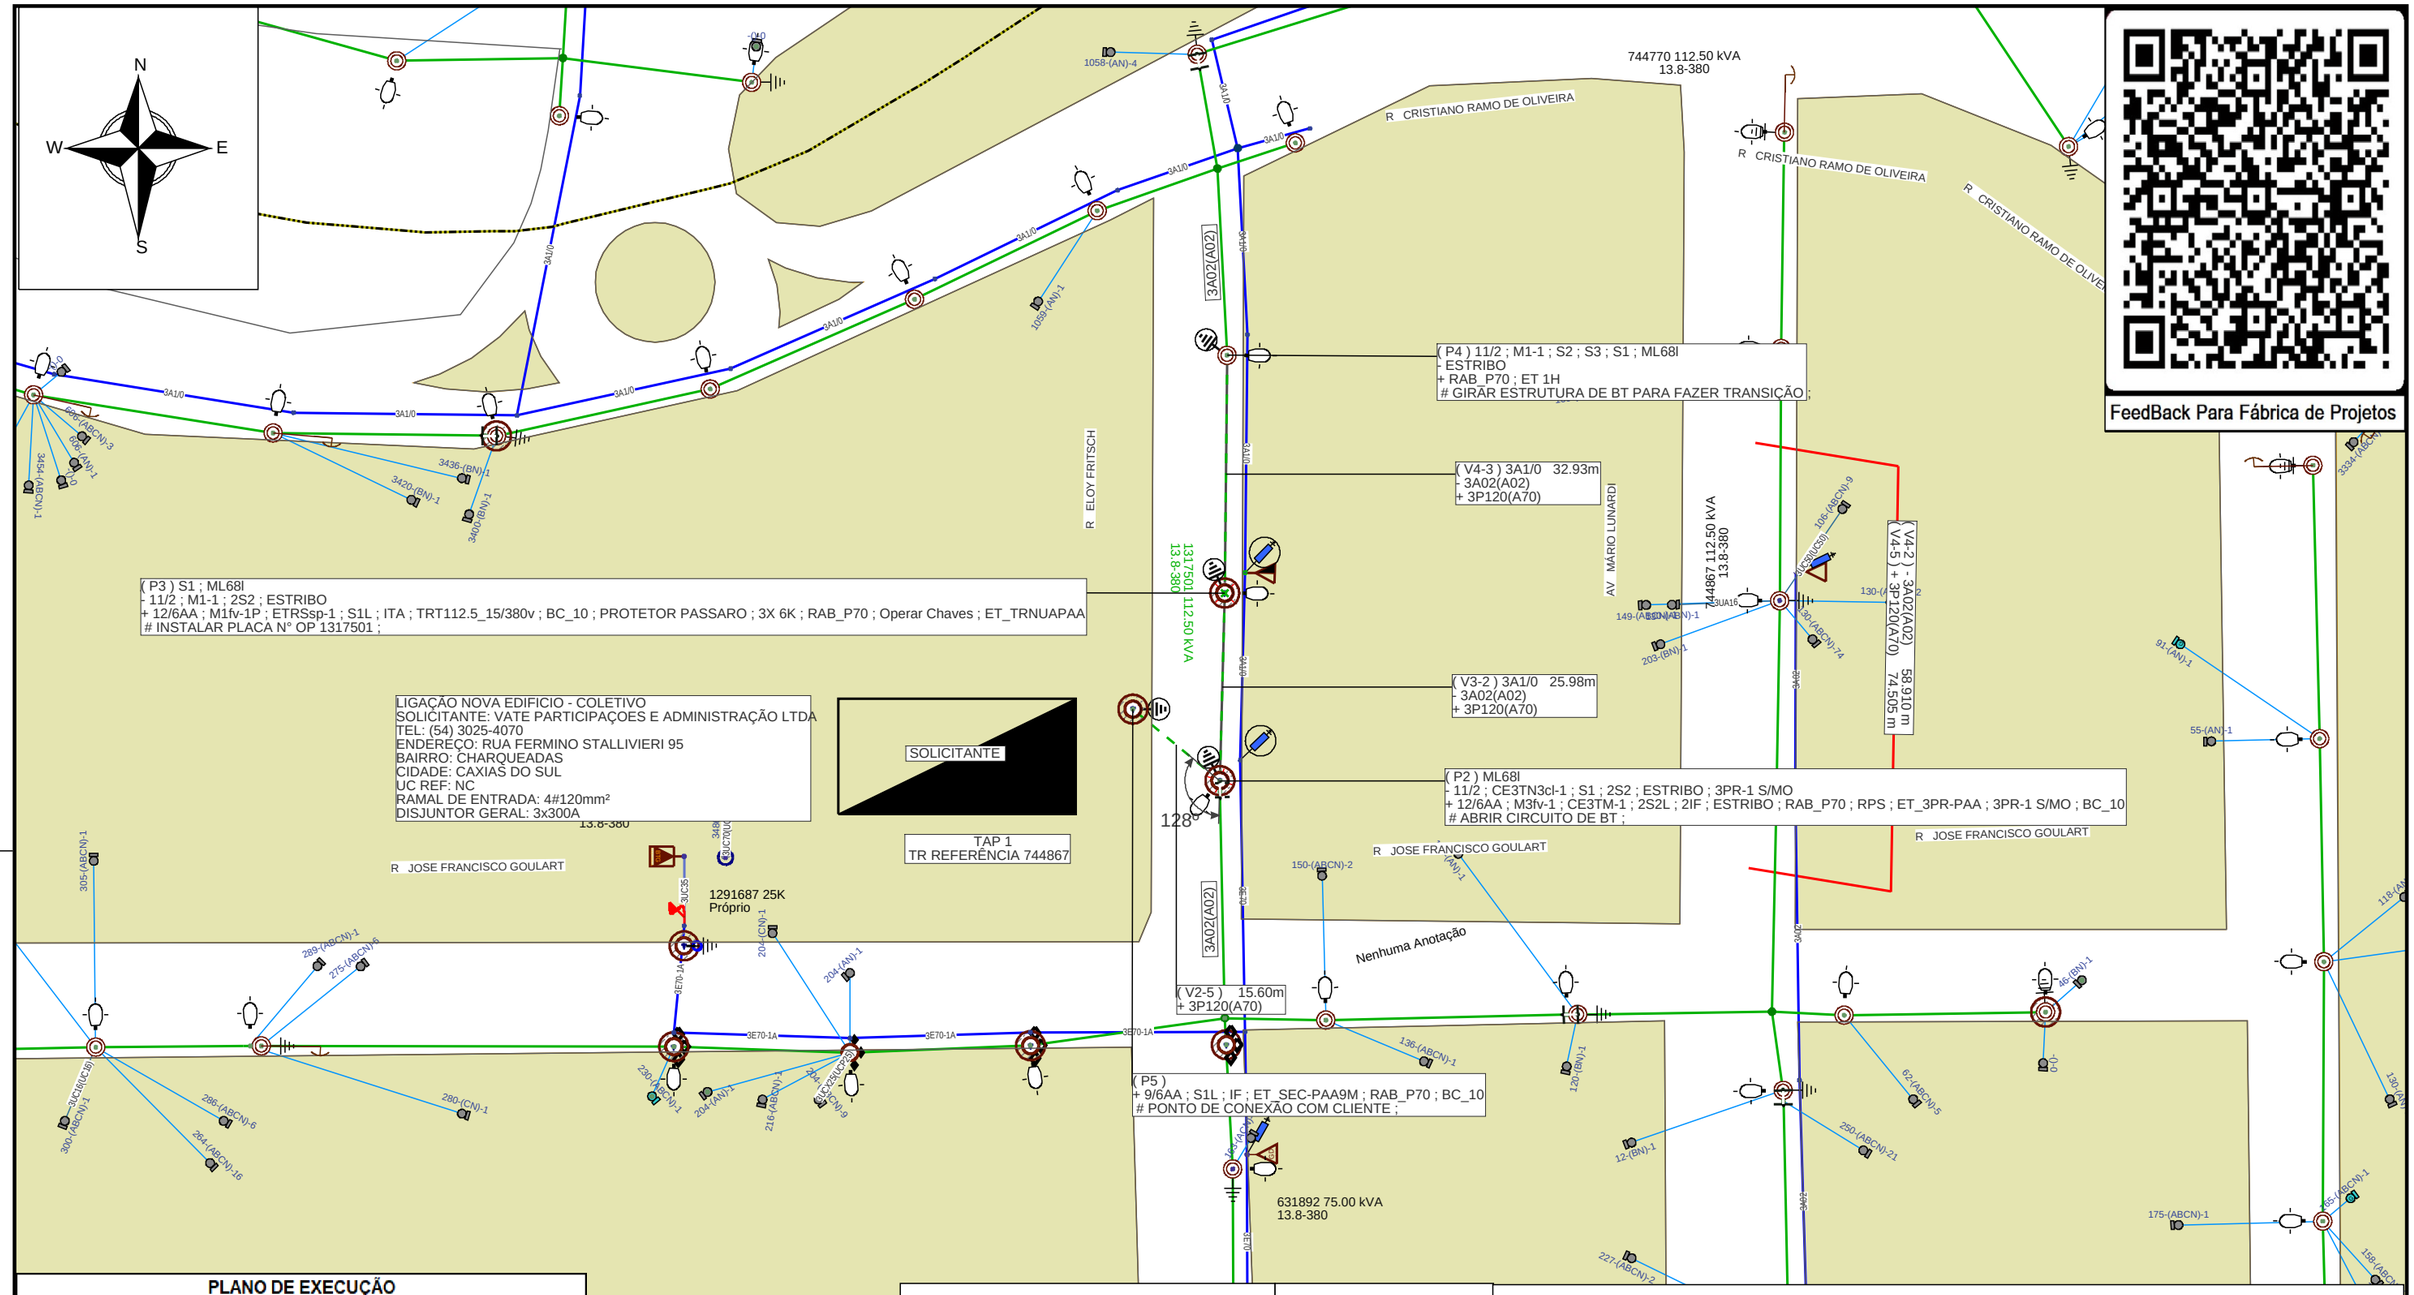


PLANO DE EXECUÇÃO

Abrir cavas e preparar a obra. Para atividades em Mt no P3 e P2 utilizar auxílio da LV, demais atividades utilizar LM.
Planejado manobrar os equipamentos citados abaixo para execução da obra.
Previsto recondutorar rede Bt e instalar Tr para atender nova ligação.
Executar as atividades conforme projeto, demais alterações solicitar via D.I.
MO Para manobras pagas em P3.

EXECUTAR AS ATIVIDADES COM SEGURANÇA E CAPRICHO.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	631892	61	5	305
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		305

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Marcelo Machado

Marcelo da Fontoura Machado
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 054.031.390-44

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: VATE PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Obra: LIGAÇÃO NOVA EDIFICIO - COLETIVO

Endereço: R ENDERECO PROVISORIO S/N1 99999-999 CAXIAS DO SUL BR RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 27/04/2026	Nota: 300001134401
Classe de isolação: 15kV	AL: CXA35	Folha 1
Projetista: Marcelo Machado	Projeto: 000008023883	Levantador: Ricardo Albuquerque
