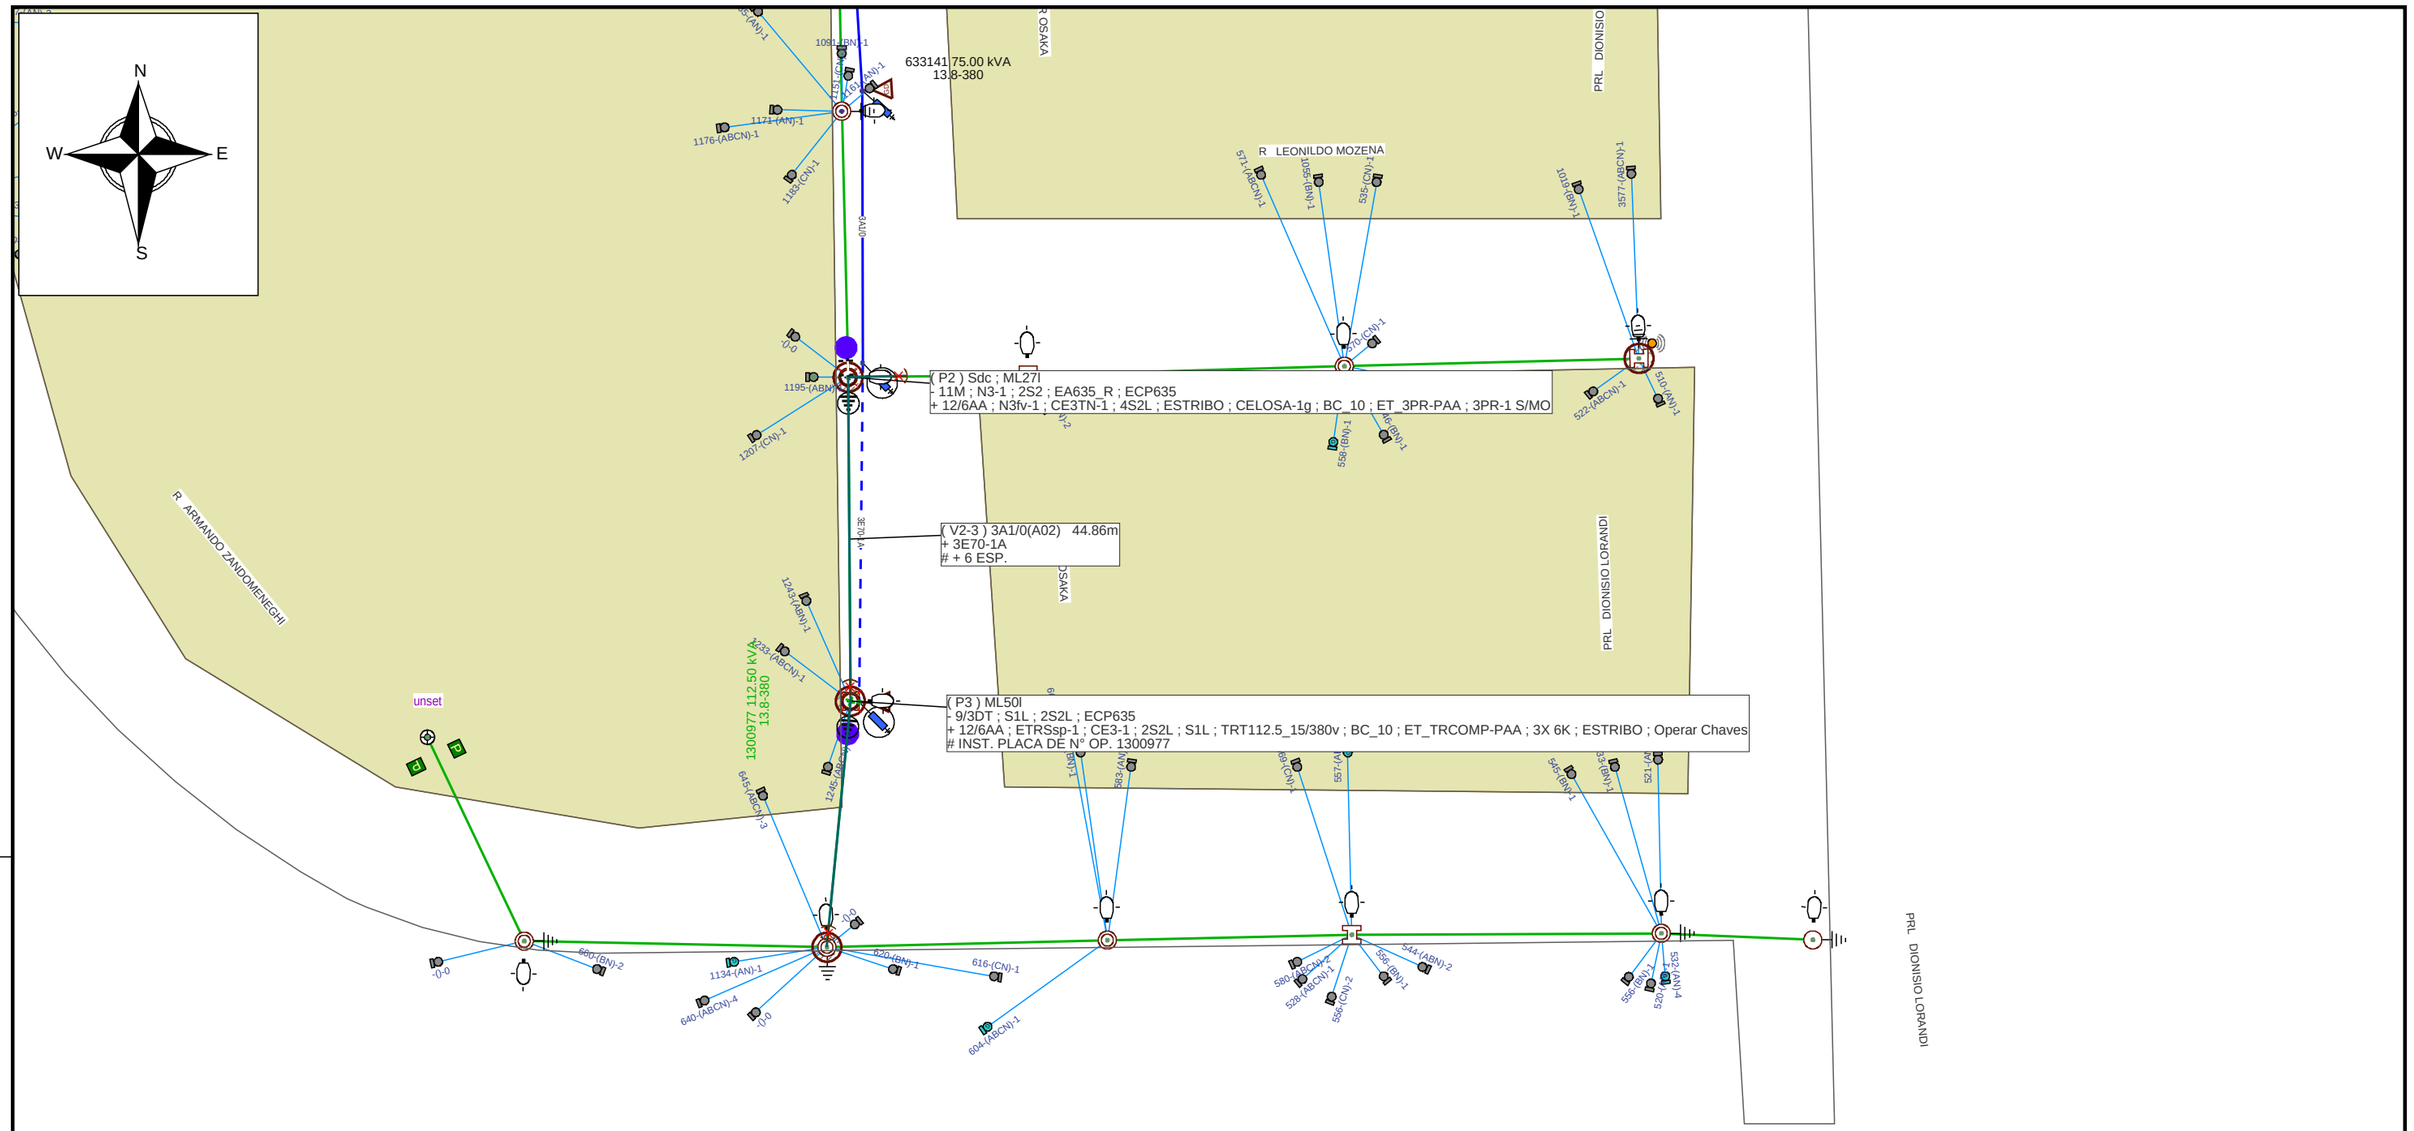


Intervir na rede confome grade de estudos abaixo para substituir as estruturas apontadas na planta kaffa;

O DEC EM ESTUDO PODE SER OTIMIZADO EM ATÉ 200.6 CHI			Quantidade de equipes sugeridas para o desligamento	0	0
Equipamento Desligado	Número Operativo	Clientes Desligados	Duração da intervenção	CHI Total	Observações (se necessário)
TRANSFORMADOR	633141	108	5	540	
ESTUDO DE CHI			Total	540	

RE: 4000212

Base interna de dados 09/06/2025

Técnico: RICARDO QUEVEDO DE ALBUQUERQUE

Data da análise: 15/01/2026

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Seja a mudança que você quer ver na segurança do trabalho.

FeedBack Para Fábrica de Projetos

5T Planeje Use Teste Sinalize Aterre

Henrique Silva Erguy Junior
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise Projetos I
CFT: 5287547404-9

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: 633141

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 29/12/2025	Nota: 000006913906
Classe de isolação: 15kV	AL: CXG13	Folha 1
Projetista: HENRIQUE ERGUY	Projeto: 000007951078	Levantador RICARDO
