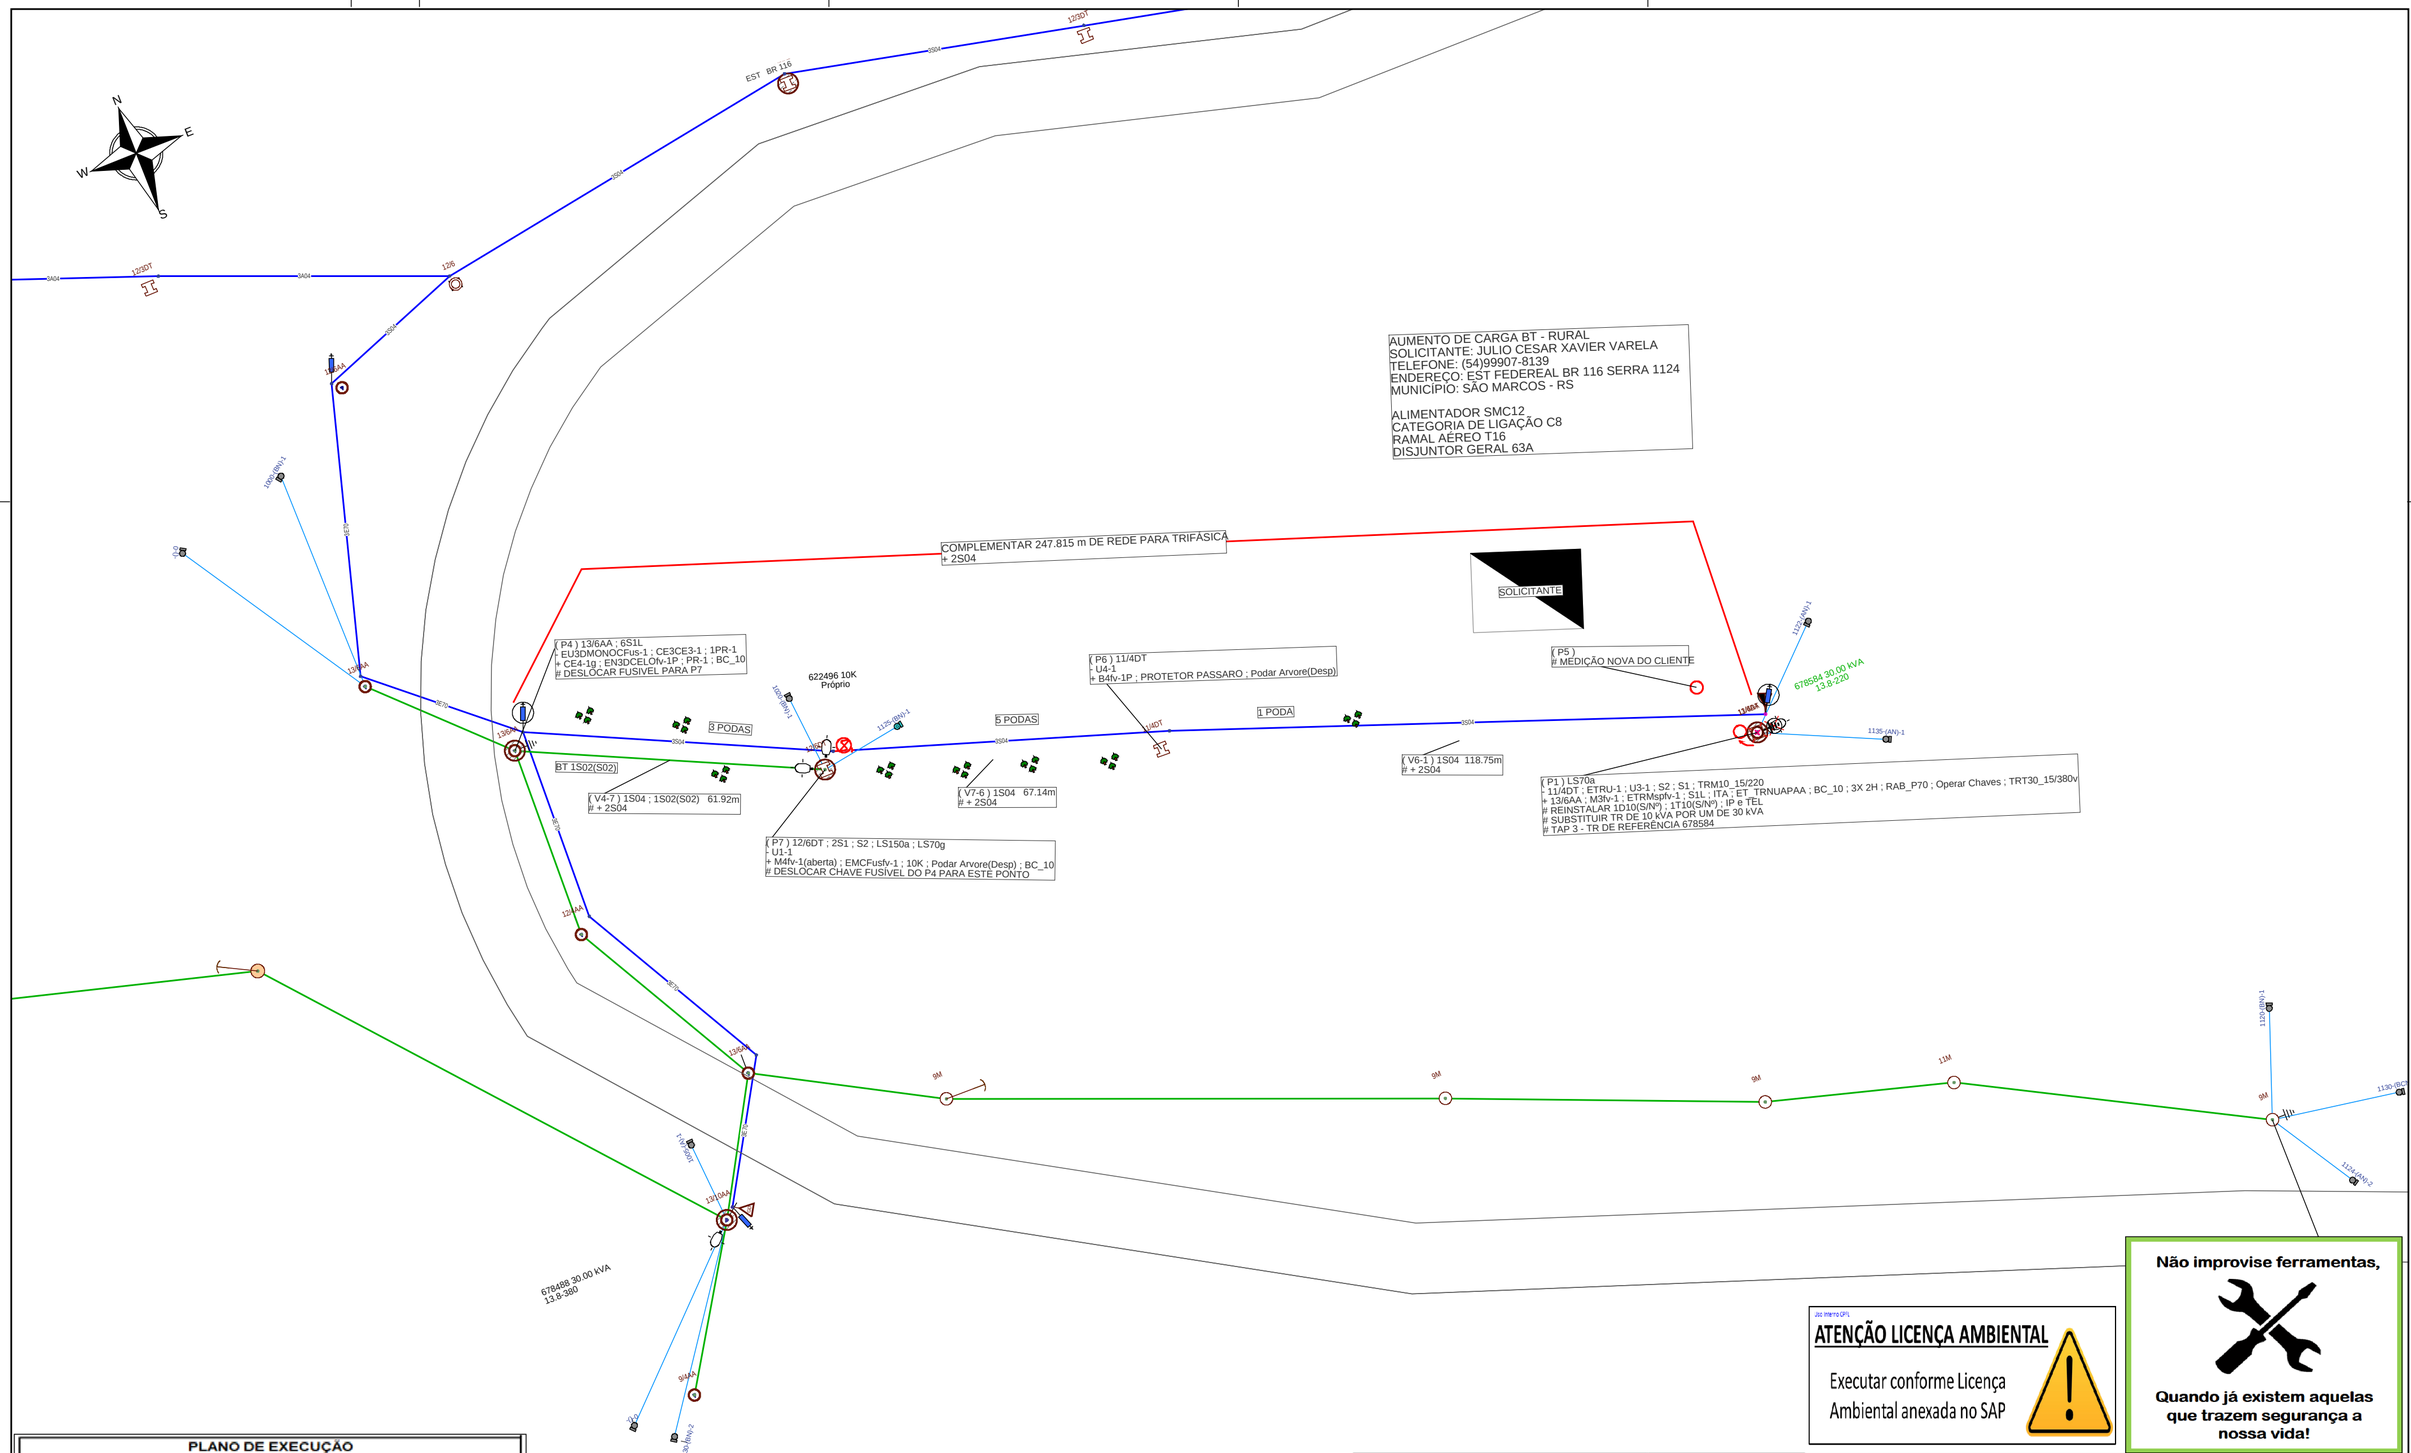

PLANO DE EXECUÇÃO

Abrir chave faca e, em LM, complementar rede para trifásica e substituir TR de 10 kVA por 30 kVA para atender a solicitação.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Faca	1116107	74	5	370
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		370

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Willian C. Mendonça

Willian Coelho Mendonça
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 04127459093

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: São Marcos

Cliente: JULIO CEZAR XAVIER VARELA

Obra: ALTERAÇÃO DE FASE BT - RURAL

Endereço: EST FEDERAL BR 116 SERRA 1124 95190-000 SAO MARCOS BR RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 18/12/2025	Nota: 300001104995
Classe de isolação: 15kV	AL: SMC12	Folha 1
Projetista: Willian Coelho	Projeto: 000007946320	Levantador: Marcio Bedin
